

TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 110/2020 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO PROJETO “BIODIVERSO”, RELATIVO AO PROGRAMA REM MATO GROSSO – SUBPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

1. O **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO**, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, neste ato regularmente representado por seu **Superintendente de Programas, Manoel Serrão Borges de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro de pesca, portador da cédula de identidade nº 986314, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.176.634-91, doravante denominado **Funbio**; e

2. A **ASSOCIAÇÃO PACTO DAS ÁGUAS- ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS**, associação civil sem fins lucrativos, estabelecida na Av. Padre Ezequiel Ramim, nº 754, Centro, Aripuanã-MT, CEP 78.325-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.123.706/0001-06, neste ato representada por seu **Diretor Presidente, Everaldo Dutra dos Santos**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 372264, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.443.891-72, doravante denominada **Responsável pelo Projeto**.

Resolvem, por este Instrumento, ENCERRAR O CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 110/2020, celebrado em 16 de novembro de 2020, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Funbio** e a **Responsável pelo Projeto**, de comum acordo, formalizam o encerramento do Contrato de apoio técnico e financeiro nº 110/2020, celebrado entre as partes em 16 de novembro de 2020, para implementação do Projeto “BIODIVERSO”, reconhecendo estar extinto o objeto do referido Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – A **Responsável pelo Projeto** deverá arquivar toda a documentação original relativa à execução do Projeto, por um período de cinco anos a contar da data de assinatura deste Termo, ou pelo prazo exigido pela legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior.

2.2 – A **Responsável pelo Projeto** compromete-se a utilizar todos os bens adquiridos com os recursos do projeto exclusivamente em prol da recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira.

2.3 – Declaram as partes estarem quites com todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais e/ou previdenciários relacionados ao objeto acordado, sendo que a **Responsável pelo Projeto** se responsabilizará por eventuais encargos dessa natureza que venham a ser conhecidos em data superveniente à da assinatura deste instrumento.

2.4 – As Partes, neste ato, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação em relação às obrigações e direitos decorrentes do Contrato, ora formalmente encerrado, inclusive em relação às prestações de contas referentes a todo o Projeto, permanecendo válidas somente as obrigações constantes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

3.1 – Os seguintes documentos integram o presente instrumento:

- 1) Parecer Financeiro Final – Anexo A; e
- 2) Parecer Técnico Final – Anexo B

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

4.1 – A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

4.2 – As disposições deste Contrato refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

4.3 – Fica eleito o Foro da Comarca da capital do Rio de Janeiro/RJ para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As Partes e duas testemunhas declaram e concordam que a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Encerramento e seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).

Assinam o presente, de forma eletrônica, com a ciência de duas testemunhas.

Pelo Funbio


Manoel Serrão Borges de Sampaio (24 de abril de 2024 17:42 ADT)

Manoel Serrão Borges de Sampaio
Superintendente de Programas

Pela Responsável pelo Projeto


Everaldo Dutra dos Santos (24 de abril de 2024 14:45 ADT)

Everaldo Dutra dos Santos
Diretor Presidente

Testemunhas:


Natália Corrêa Santos

Nome: Natália Corrêa Santos
CPF: 136.700.197-82
ID: 24080824-6 – DETRAN/RJ


Matheus Duarte Ramos (24 de abril de 2024 15:10 ADT)

Nome: Matheus Duarte Ramos
CPF: 057.965.377-33
ID: 21.927.610-2 – DIC-RJ

Data: 18/05/2023

De: Ana Paula França Lopes – **Analista Financeiro**

Para: Gerência Programa REM Mato Grosso

- **Programa:** REM Mato Grosso
- **Subprograma:** AGRICULTURA FAMILIAR
- **Projeto:** “BIODIVERSO”
- **Instituição responsável:** ASSOCIAÇÃO PACTO DAS ÁGUAS- ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
- **Objetivo do projeto:** Consolidar alternativas de geração de renda, fortalecimento organizacional, produção e desenvolvimento sustentável para seringueiros da Reserva Estadual Extrativista Guariba-Roosevelt e pequenos agricultores de sua zona de amortecimento como estratégia para proteção da biodiversidade e combate às mudanças climáticas.
- **Classificação de Risco:** Substancial
- **Dados Contratuais:**

VIGÊNCIA DO CONTRATO	Geral	Inicial	Aditivo
	30 Meses	18 Meses	12 Meses
Início	16/11/2020	16/11/2020	16/05/2022
Encerramento	16/05/2023	16/05/2022	16/05/2023
Valor do Contrato	R\$ 1.693.214,85	R\$ 1.693.214,85	R\$ -
Funbio/REM-MT	R\$ 1.498.364,85	R\$ 1.498.364,85	R\$ -
Contrapartida	R\$ 194.850,00	R\$ 194.850,00	R\$ -

- **Desembolsos:**

DESEMBOLSOS	VALOR	% TOTAL PROJETO
3º desembolso realizado em 09/08/2022	R\$ 177.808,47	11,87%
A desembolsar	R\$ -	0,00%

- **Prestação de Contas:**

Com base na 3ª prestação de contas apresentada pela instituição, conforme os dados abaixo, segue a análise:

3ª Prestação de Contas	01/06/2022 a 11/05/2023		
	Valor	% Previsto Período	% Total Projeto
Saldo Anterior	R\$ 11.109,55		
2º desembolso	R\$ 177.808,47		11,87%
Rendimentos Líquidos	R\$ 1.942,94		
Total de Receitas	R\$ 190.860,96		
Despesas do Projeto	R\$ (149.308,76)		
Tarifas Bancárias	R\$ (1.841,93)		
Total de Despesas	R\$ (151.150,69)	80,01%	10,09%
Saldo do projeto em 11/05/2023	R\$ 39.710,27		
Saldo bancário em 11/05/2023	R\$ 39.710,27		

➤ **Análise da Prestação de Contas:**

Analisamos a Prestação de Contas Final e referindo-nos aos recursos do Funbio/REM-MT o projeto apresentou uma execução equivalente a 80,01% da soma dos recursos disponibilizados para o último semestre.

Conferimos o extrato bancário e o relatório de despesas e os mesmos estão de acordo com a conciliação apresentada. Não há discrepância informada na conciliação.

Identificamos que alguns serviços foram realizados e custeados com o recurso do projeto sem a elaboração de um Contrato ou de um Termo Aditivo e houve pagamentos após o término do prazo de execução, mas dentro da vigência contratual, porém ressaltamos que ambos os casos com autorização da gerência.

A documentação comprobatória das despesas dos recursos Funbio/Programa REM-MT foi analisada por amostragem, conforme a classificação de risco média. Assim, foram verificados 75,42% dos recursos prestados contas totalizando R\$113.078,16 e 52,45% do total de eventos apresentados, resultando em 75 eventos analisados, e, a documentação não apresentou irregularidade.

Quanto a Contrapartida, a comprovação apresentada atingiu 127,00% do valor previsto para o último semestre.

➤ **Conclusão:**

Em relação aos recursos repassados pelo Funbio/REM-MT, a execução total foi de R\$ R\$1.471.864,38 representando 97,37% do valor contratual incluindo os rendimentos.

A comprovação acumulada de Contrapartida foi de R\$194,850,00, representando 100,00% em relação a totalidade contratual. para a modalidade contrapartida.

O saldo remanescente de R\$ 39.710,27 foi devolvido em 15/05/2023 para a conta operativa do REM-MT, conforme comprovante anexo. Assim, consideramos aprovada a prestação de contas e o projeto financeiramente encerrado.

Apresentamos a seguir os quadros informativos quanto ao Resumo Financeiro Acumulado do projeto até o momento, a execução acumulada comprovada por Subatividades, Tarefas e Subtarefas e o gráfico de Acompanhamento do Desempenho por atividade.

No quadro “Execução acumulada comprovada por Subatividades, Tarefas e Subtarefas” o valor apresentado na coluna de Valor Planejado após Remanejamento” difere do instrumento contratual, pois leva em consideração o ganho de rendimentos da aplicação financeira.


RESUMO FINANCEIRO	VALORES ACUMULADOS	%
		TOTAL
Recursos Depositados ao projeto	R\$ 1.498.364,85	100,00%
Rendimentos	R\$ 13.209,80	0,88%
Total Executado do recurso Funbio/REM-MT	R\$ (1.466.645,39)	97,88%
Tarifas Bancárias	R\$ (5.218,99)	0,35%
Total da Contrapartida apresentada	R\$ (194.850,00)	100,00%
Saldo do Projeto	R\$ 39.710,27	2,35%
Saldo do Recurso Funbio/REM-MT	R\$ 39.710,27	2,65%
Saldo de Contrapartida	R\$ -	0,00%

- Execução acumulada comprovada por Subatividades, Tarefas e Subtarefas.

Objetivo/ resultado esperado/ atividades	Valor Planejado após Remanejamento	Valor Comprovado	%
Subatividade: - OBJETIVO ESPECÍFICO A1: Preparar as organizações sociais, para maior autonomia e sustentabilidade na gestão sócio produtiva da floresta.	R\$ 90.500,45	R\$ 67.427,95	74,51%
Tarefa: - Resultados esperados A1.2- As atividades a serem desenvolvidas nesse objetivo levarão ao alce dos resultados: Compra e formação de estoque de 20 toneladas de produtos do agro extrativismo da Resex; 100 mil reais acessados de fontes não reembolsáveis ou de políticas e programas de apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar e sociobiodiversidade (PAA, PNAE e PGPMBio); 10 toneladas de amêndoas beneficiadas e comercializadas no âmbito do APL; 01 Site criado e paginas de redes sociais das associações atualizadas com os produtos da sociobiodiversidade, artesanato e do agroextrativismo, bem como informações sobre a importância ecológica da Resex para reforçando o valor socioambiental; 10 Jovens capacitados em Marketing Digital para operacionalização do site e das redes sociais das associações.	R\$ 90.500,45	R\$ 67.427,95	74,51%
Subtarefa: - Atividade 1.2.3: Formalização de um Arranjo Produtivo Local- APL e aquisição de equipamentos para melhoria e potencialização dos processos de beneficiamento de castanha do Brasil.	R\$ -	R\$ -	0,00%
Subtarefa: - Atividade 1.2.4: Consultoria em produtos digitais para criação de 01 site para 02 associações da Resex e ajuste das	R\$ -	R\$ -	0,00%
Subtarefa: - Atividade 1.2.5: Realizar 01 oficina de 24h em Marketing Digital para 10 jovens associados para que sejam preparados para alimentar adequadamente as redes sociais, bem como fazerem a atualização e manutenção de conteúdos do site, de modo a tornas as Associações mais autônomas na manutenção de suas ferramentas de comunicação com o mercado.	R\$ -	R\$ -	0,00%
Subtarefa: - Atividade A1.2.1-Capital de giro para aquisição de matéria prima e formação de estoque de castanha, farinha de	R\$ 73.000,00	R\$ 49.927,50	68,39%
Subtarefa: - Atividade A1.2.2: Apoio institucional para manutenção de regularidade documental, fiscal e contábil de 2 associações da Resex e uma cooperativa de pequenos agricultores;	R\$ 17.500,45	R\$ 17.500,45	100,00%
Subatividade: - OBJETIVO ESPECÍFICO A1: Desenvolver a gestão, a governança e a disseminação dos conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável para os povos da floresta.	R\$ 1.147.298,97	R\$ 1.022.846,50	89,15%
Tarefa: - Resultado esperado A1.3 : Resultados esperados A3.1-Busca-se por meio deste objetivo, dar suporte ao desenvolvimento das atividades dos demais objetivos na busca pelos seguintes resultados: 230 produtores acompanhados pela assistência técnica para aplicação das boas práticas de produção de castanha, borracha, copalba e farinha de mandioca; 03 empreendimentos comunitários (02 Associações da Resex 01 Cooperativa de Agricultores da área amortecimento), com assessoria; 03 termos de cooperação firmados com setor público ou privado para potencializar os resultados do projeto; 01 reunião de apresentação e planejamento do projeto; 02 reuniões de monitoramento e avaliação do projeto; 04 banners do projeto; 04 adesivos de veículos; 600 calendários personalizados com dicas de boas práticas de produção de castanha, borracha e óleo de copalba.	R\$ 1.147.298,97	R\$ 1.022.846,50	89,15%
Subtarefa: - Atividade A1.3.1: Contratação de recursos humanos para atuação no desenvolvimento da gestão administrativa, financeira e contábil do projeto, bem como para o desenvolvimento das atividades técnicas e consultorias	R\$ 629.287,20	R\$ 614.437,19	97,64%
Subtarefa: - Atividade A1.3.2 : Apoio a manutenção de um escritório regional de suporte a equipe técnica do projeto;	R\$ 390.467,78	R\$ 309.865,32	79,36%
Subtarefa: - Atividade A1.3.3: Produção de conteúdos comunicação para divulgação e disseminação das experiências do	R\$ 8.690,00	R\$ 8.690,00	100,00%
Subtarefa: - Atividade A1.3.4: : Aquisição de equipamentos permanentes para apoio ao desenvolvimento do projeto;	R\$ 118.853,99	R\$ 89.853,99	75,60%
Subatividade: - OBJETIVO ESPECÍFICO A1: Estimular a geração de renda e o desenvolvimento sustentável por meio do apoio à produção e agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade e do agroextrativismo comunitário da Resex e de pequenos produtores da zona de amortecimento.	R\$ 455.415,43	R\$ 376.370,94	82,64%
Tarefa: - Resultados esperados A1.1-Esperamos que no desenvolvimento das atividades desse objetivo possamos alcançar os seguintes resultados: Produção de 50 toneladas de castanha, 15 toneladas de borracha e 01 tonelada de óleo de copalba com práticas de produção padronizadas e com assistência técnica periódica; 70 extrativistas capacitados para desenvolverem suas atividades produtivas de forma padronizadas e em conformidade normas ambientais e sanitárias; Sistema de transporte implementado e operando para redução dos custos logísticos e ampliando a capacidade de atendimento dos mercados formais e institucionais dos municípios de Aripuanã e Colniza; Produção e comercialização de 5 toneladas de farinha de mandioca; 35 mulheres capacitadas; Participação em 03 feiras de artesanatos ou encontros com temática do gênero; Adequação e padronização de embalagens de acordo com normas sanitárias; 40 agricultores, extrativistas e técnicos capacitados; e 150 análises de aflatoxina realizadas.	R\$ 455.415,43	R\$ 376.370,94	82,64%
Subtarefa: - Atividade A1.1.1: Aquisição e fornecimento de utensílios, materiais e combustível para limpeza, ampliação e	R\$ 58.158,82	R\$ 58.158,82	100,00%
Subtarefa: - Atividade A1.1.2: Consultoria para realizar oficina de padronização das boas pratica de produção de borracha e	R\$ 14.346,67	R\$ 14.346,67	100,00%
Subtarefa: - Atividade A1.1.3- Estruturação do sistema de transporte da Resex Guariba Roosevelt para dar suporte as atividades	R\$ 257.800,22	R\$ 257.800,00	100,00%
Subtarefa: - Atividade A1.1.4-Fortalecimento da cadeia produtiva da farinha de mandioca a partir aquisição de novos	R\$ 37.093,00	R\$ 37.093,00	100,00%
Subtarefa: - Atividade A1.1.5-Promover o aprimoramento das práticas de produção, formação preço e comercialização de	R\$ 6.770,52	R\$ 6.770,52	100,00%
Subtarefa: - Atividade A1.1.6-Construção de layout e aquisição de embalagens para comercialização de castanha em amêndoas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Subtarefa: - Atividade A1.1.7-Promoção do conhecimento e a reaplicação de tecnologia de baixo carbono com a realização de 1	R\$ 16.496,00	R\$ 496,00	3,01%
Subtarefa: - Atividade A1.1.8-Monitorar os níveis de aflatoxina da produção de castanha da Resex Guariba Roosevelt e indicar	R\$ 64.750,20	R\$ 1.705,93	2,63%
Soma	R\$ 1.693.214,85	R\$ 1.466.645,39	

- Acompanhamento do Desempenho por atividade.

Indicador de desempenho do projeto

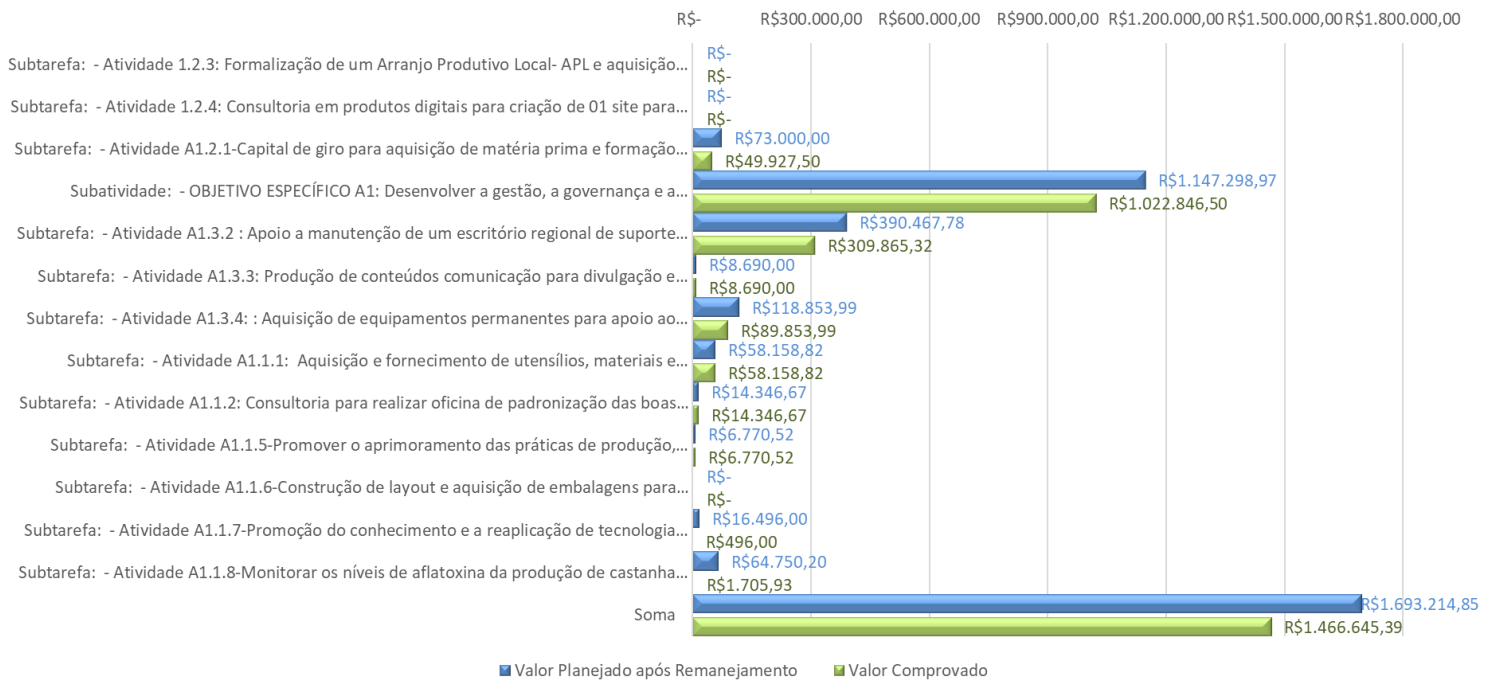

Ana Paula Lopes
Analista Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381510065961531
15/05/2023 10:13:26

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:03
095100951 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PACTO-PROJETO BIODIVERSOS
AGENCIA: 0951-2 CONTA: 79.420-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.519.000.024.486
VALOR TOTAL	39.710,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO B P BIODIVERSIDADE	
AGENCIA: 3519-X	CONTA: 24.486-4
NR. DOCUMENTO	550.951.000.079.420

=====

NR.AUTENTICACAO	D.06F.6B3.1B7.7EE.6B9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC157332 EVERALDO DUTRA DOS SANTOS.

ANEXO B: Relatório Final

Título do projeto:

PROJETO BIODIVERSO

Instituição responsável:

PACTO DAS AGUAS Elaboração e Desenvolvimento de Projetos Socio Ambientais

Linha (s) de ação/Eixo (s) Temático (s):

A - Consolidar sistemas de produção que valorizem a floresta em pé. C - Consolidaçãoe

Coordenador do projeto (nome e e-mail):

JOÃO MANOEL S. PERES - joaomanoel@pactodasaguas.org.br

Período de abrangência do Projeto:

15/12/2020

16/02/2023

Data de envio deste relatório:

23/05/2023

Beneficiários (nº):

73 famílias

Área de atuação:

RESERVA ESTADUAL EXTRATIVISTA GUARIBA ROOSEVELT - COLNIZA E ARIPUANA MT

Valor total do projeto:

R\$ 1.693.215,00

O Relatório de Resultados Final é dividido em duas seções. A SEÇÃO 1 deve conter a descrição do andamento do projeto referente ao último período de execução do mesmo e a SEÇÃO 2 deve conter uma apresentação dos principais aspectos da realização do projeto durante todo seu período de execução.

SEÇÃO 1

Esta seção deve conter informações relativas somente ao último período de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

Último período de execução do Projeto:

01/07/2022	16/02/2023
------------	------------

1. Descrição do andamento do projeto

Objetivo específico A1.:

Estimular a geração de renda e o desenvolvimento sustentável por meio do apoio à produção e agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade e do agroextrativismo comunitário da Resex e de pequenos produtores da zona de amortecimento.

A1.1.1.: Compra e fornecimento de utensílios e combustíveis para apoio ao manejo e transporte de borracha nativa, castanha da Amazônia e copaíba.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Procedimento de aquisição no comércio local realizando tomada de preços três cotações e posteriormente os Utensílios e equipamentos foram repassados a todos os extrativistas envolvidos na coleta de castanha através das associações. Foram adquiridos e repassados os insumos conforme a necessidade das atividades. A aquisição dos materiais para desenvolvimento das atividades extrativista foi realizada no primeiro semestre. O projeto continuou fornecendo suporte técnico, logístico e financeiro através de entrega de utensílios (gasolina, sacarias, fretamento) necessários para o bom desenvolvimento das atividades visando alcançar as metas estabelecidas. Portanto até o momento nas safras 20/21 e 21/22 foram produzidas: 53,8 toneladas de castanha do Brasil, gerando cerca de R\$ 322.000,00, levando em consideração que variação de valores do preço entre safrinha e safra, mas em média o valor pago ao castanheiro girou em R\$6,00 o quilo da castanha do Brasil, limpa e selecionada. Foram assinados dois contratos de compra e venda entre a Associação AMORARR e a Empresa Real Castanhas do Brasil Eireli onde ficou acordado que seria pago o preço de pauta do produto mais o valor de acréscimo a título de

pagamento por Serviços Socioambientais totalizando R\$ 6,00 o quilo. Contratos e notas fiscais em anexo. A safra de castanha do Brasil é uma das principais atividades econômicas, inicia em novembro e finaliza em abril, envolvendo toda a maioria da comunidade nessa atividade. 10,5 toneladas de Borracha natural gerando mais de R\$ 100.000,00 com preço de R\$ 10,00 pago ao seringueiro, destas 10,5 t já foram comercializadas via contrato entre a AMORARR e a Empresa V. Fair Trade Comercio e Exportação de Calçados e A acessórios Ltda 8.265 quilos. O contrato renovado para a safra 2022 seguindo as normas de pagamento por Serviços Socioambientais A pesagem do segundo lote de Borracha natural ocorrerá em agosto de 2022, a estimativa é que ultrapasse a novamente as 10, (dez) toneladas. Com relação a produção de copaíba, está sendo realizada o mapeamento das mesmas e formação de grupos de copaibeiros para que nesse período de seca safra 2022 possa iniciar a atividade. Foi realizado o curso de boas práticas para padronização na produção de óleo de copaíba. A uma carta de interesse da empresa Kaapi Ingredientes sediada em Campinas, SP, que comercializa ingredientes naturais para perfumaria e aromaterapia. A empresa tem forte compromisso com a ética e a sustentabilidade e, para tornar público seu compromisso, em 2021 se tornou membro da UEBT (União para o Biocomércio Ético). Para a aquisição dos ingredientes que comercializa, principalmente na região Amazônica, a empresa trabalha prioritariamente com parcerias, atuando sempre que possível junto a associações e cooperativas representativas de comunidades tradicionais, que produzam pelo extrativismo sustentável em Unidades de Conservação de uso sustentável, como Reservas Extrativistas e Terras Indígenas. A proposta está sendo atualizada os valores com uma contraproposta da AMORARR. A Comercialização de farinha de mandioca, após a consultoria realizada e as orientações repassadas aos produtores a atividade está em crescimento, no primeiro semestre foram produzidas 3,5 toneladas e nesse segundo semestre já ultrapassou as 3, 0 toneladas totalizando 6,5 toneladas de farinha de mandioca tipo puba com preço médio de R\$9,00 o quilo pago ao produtor. Boa parte da comercialização é realizada no município de Aripuanã que há uma demanda crescente pelo produto devido a um fluxo de pessoas e os empreendimentos no município. A safra borracha inicia no mês de abril, nos meses, maio, junho e julho o projeto Biodiverso realizou a entrega dos combustíveis para o escoamento da safra para o barracão central, e forneceu suporte técnico. SAFRA DE BORRACHA GUARIBA – ROOSEVELT. Nas datas de 27 a 30 de junho de 2022, nas comunidades da Resex Guariba Roosevelt, foi feito o acompanhamento de visita técnica da Empresa Vert/Veja aos produtores, reunião com as associações, palestra sobre a empresa e certificação e reunião com a equipe da Pacto das Aguas. Acompanhamento do diálogo com a empresa VERT/VEJA na aquisição da produção da borracha, através de definição de estratégias de produção, embarque e transporte, elaboração e formatação de contrato e suporte das demandas junto as associações. Foram realizadas visitas nas colocações. A reunião com a comunidade se iniciou com a apresentação da Vert/Veja com video institucional demonstrando a origem da empresa e de seus principais fundadores pelo mundo de estudar projetos de sustentabilidade em grandes empresas. Os franceses François – Ghislain Morillion e Sebastien Kopp dois amigos franceses decidiram montar uma marca 100% ecológica, sustentável, para isso visitaram alguns países, alguns lugares para se inspirar, mas se apaixonaram pela Amazônia. Eles queriam propor um produto que tivesse um impacto social positivo e que também fosse ecológico e como eram amantes de tênis, surgiu a Vert. Conheceram a produção da borracha nativa da Amazônia com a tecnologia da FDL (folha defumada liquida) e depois avançou para compra do CVP – Cernambi Virgem Prensado. Ambos os processos preparam a borracha ainda dentro da floresta, sem químicos e sem a necessidade de intermediários, permitindo uma


melhor remuneração aos seringueiros. A relação comercial com a Resex Guariba – Roosevelt iniciou-se em 2019/2020 e se fortaleceu em 2021 com o Contrato de venda articulada pelo Projeto Biodiverso e firmado entre a AMORARR/COOPERACRE/VERT-VEJA, visando a comercialização de 20 toneladas de borracha nativa nos anos de 2021 e 2022. Atualmente a Resex Guariba Roosevelt é o único no território do estado onde a Vert/Veja trabalha com associações de seringueiros. Durante a reunião foi realizado o Diagnostico de Base de produção com os dados abaixo e apresentadas condições e valores que serão pagos aos seringueiros e o repasse para a associação No dia 28 de julho de 2022 a AMORARR através de oficio solicitou adiantamento de recurso para a empresa VEJA/COOPERACRE. Em reunião com a representante da AMORARR realizada no dia 03 de agosto de 2022 ficou definido os seguintes encaminhamentos:

- A pesagem que estava pré-agendada para o dia 15 de agosto, será antecipada para os dias 08 a 10 de agosto de 2022;

- Levantamento da produção nas colocações;
- Confecção dos recibos e coletas de assinaturas;
- Atualização dados informações dos seringueiros;
- Preenchimento documentação empresa Vert;
- Orientação relacionada a certificação orgânica;

Portanto a primeira pesagem do ano ocorreu na sede da associação nos dias 07 e 08 agostos de 2022, totalizando a produção AMORARR/AMARR realizou a sua primeira pesagem de borracha do ano assim totalizando 7.505 kg de borracha nativa. A aquisição de um caminhão com capacidade de 05 toneladas para carga possibilitou o transporte da produção até seu destino final em Sena Madureira no Acre, foram realizadas duas viagens de entrega percorrendo mais de 4.000 km de distância e gerando uma economia de mais de 10 mil reais em frete,

No mês de setembro de 2022 foram realizadas as entregas para a empresa via COOPERACRE, sendo a primeira foram 4.000 kg (4.050 kg), e na segunda entrega 3.340 kg (3.455), totalizando 7.505 kg, No dia 04 de dezembro de 2022 iniciamos as visitas técnicas para verificação das boas práticas na produção de borracha aonde o técnico passou em todas colocações produtoras conversando e planejando o melhor dia para pesagem da produção de todos, onde ficou combinado aos dias 17 a 20/12/2022 transporte para o barracão da associação e pesagem da produção. O projeto Biodiverso ajudou a comunidade no transporte da produção e com combustível para produtores chegarem até barracão central totalizando 4.200 kg de borracha nativa que está armazenada no barracão com previsão de envio no mês de abril, assim tendo aumento na produção e totalizando 11.705 kg e aumento de produtores concretizando os objetivos do projeto.

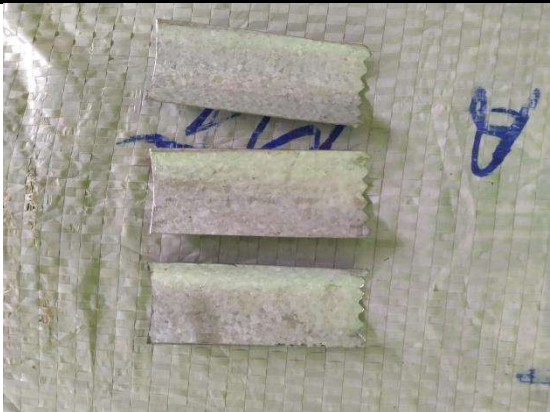	
Lâmina de sangria de seringa com cabo.	bicas de bater.
	
Tigelas.	
	
Galão 5 litros	Trado manual 3/4



Reunião Coordenação e AMARR



Reunião Coordenação e AMORARR



Reunião coordenação, Associação e empresa



Reunião coordenação, Associação e empresa



Transporte fluvial da produção



Transporte da produção para barracão



Transporte da produção castanha



Transporte da produção

Produção Borracha nativa safra 2022



Pesagem da produção borracha



Transporte borracha barracão



Transporte da produção para barracão



Reunião Coordenação, AMARR e AMORARR

Produção de farinha de mandioca 2022



Produção de farinha de mandioca



Produção de farinha de mandioca



Farinha pronta para comercialização



Pronta para comercialização



Transporte da produção



Transporte da produção

Resultados alcançados: Aquisição de 01 caminhão e 01 barco com motor de popa para transporte da produção. Produção de 50 toneladas de castanha, 15 toneladas de borracha, atividade de extração de óleo copaíba iniciou. Desafios/dificuldades encontradas: Condições de estrada para escoamento da produção. Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Riscos: a. Ausência de demarcação física da Resex; b. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex; c. Efeitos negativos na economia global provocado pela Pandemia do COVID 19; d. Condições de estradas que dão acesso as comunidades para escoamento da produção; Oportunidades: a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade; b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã; c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil; d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional; e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA; f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso; Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados. Fotos acima.

A1.1.2.: Consultoria para realizar oficina de padronização das boas práticas de produção de borracha e óleo de copaíba.
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: Foram realizadas a contratação de consultorias para realização das oficinas de padronização de práticas de produção do óleo de copaíba, para melhoria de coleta e produtividade. A oficina foi agendada em um contexto maior com outras duas oficinas (artesanato e CVP) devido a época do ano os rios estão com sua vazão muito baixa e dificulta o transporte dos participantes, além do início da safra de extração do CVP Cernambi Virgem Prensado e aberturas e plantio de roças levando em consideração que o público alvo das três oficinas na grande maioria são as mesmas pessoas. Visando otimizar recurso, logística, tempo e ser mais objetivos a Pacto das Águas através da coordenação do projeto Biodiverso e comum acordo com a Associação e participantes recomendou as datas entre 24 de setembro a 03 de outubro para a realização

das oficinas. Portanto as oficinas foram realizadas na Comunidade São Lourenço na Reserva Extrativista Guariba Roosevelt, município de Aripuanã, Mato Grosso (Relatório em anexo). Este relatório em anexo é um documento descritivo e analítico da Oficina de Padronização e Manejo Sustentável da Produção de Borracha Nativa, ocorrida nos dias 01 e 02 de outubro de 2021, com duração de 20 horas e com a participação de 33 extrativistas da Resex Guariba-Roosevelt. Dentre eles, a presença maciça de jovens e mulheres que buscavam o aperfeiçoamento de suas práticas de manejo e produção enquanto mecanismo para fortalecimento dessa importante cadeia produtiva, atraindo novos produtores que juntos soma-se ao conjunto de guardiões da floresta, que agora são também apoiados pelo Projeto Biodiverso.



Participantes das oficinas



Roda de conversa

Resultados alcançados:

Metas estabelecidas de produção na proposta do projeto alcançadas proporcionando aumento na geração de renda.

Desafios/dificuldades encontradas:

Período de pandemia, isolamento das comunidades dificulto o acesso da equipe técnica.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Riscos:

- a. Ausência de demarcação física da Resex;
- b. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex;
- c. Efeitos negativos na economia global provocado pela Pandemia do COVID 19;
- d. Condições de estradas que dão acesso as comunidades para escoamento da produção;

Oportunidades:

- a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade;
- b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã;
- c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil;
- d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional;

- e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA;
- f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Fotos acima;
Atividade concluída no 2º relatório;
Anexo 1: Relatório da oficina.

A1.1.3.: Estruturação do sistema de transporte da Resex Guariba Roosevelt para dar suporte as atividades produtivas e econômicas de castanha, borracha, copaíba, farinha de mandioca e agricultura.


Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Transporte e agregação de valor: Nessa linha, projeto faz a aquisição de um barco com motor que será destinado à comunidade do rio Roosevelt e um caminhão que será utilizado exclusivamente para apoiar a Reserva Extrativista no transporte de seus produtos, in natura ou processados, para os barracões de armazenamento central ou para comercialização no mercado local/regional, inclusive viabilizando a participação das associações nos editais do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA-Doação Simultânea (Programa de Aquisição de Alimentos da Conab). A gestão desse veículo será realizada por meio de uma comissão mista de representantes das associações da Resex (AMORARR e AMARR) e a Pacto das águas por meio do PROJETO BIODIVERSO.

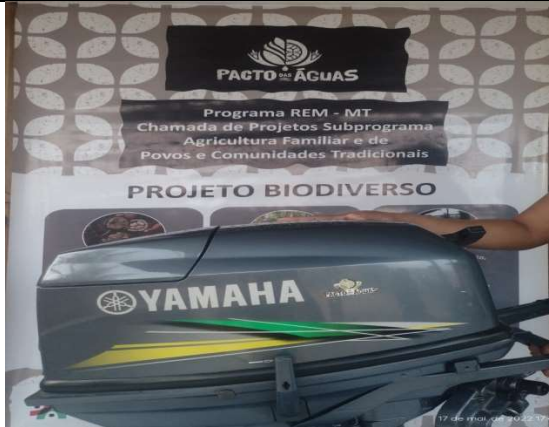

caminhão e barco voadeira	Caminhão para transporte produção
	
Caminhão para transporte	Motor de popa 30
Resultados alcançados: Equipamentos adquiridos e repassado as associações. Desafios/dificuldades encontradas: Condições de estrada dificulta a logística no período chuvoso. Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Riscos: a. Ausência de demarcação física da Resex; b. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex; c. Efeitos negativos na economia global provocado pela Pandemia do COVID 19; d. Condições de estradas que dão acesso as comunidades para escoamento da produção; Oportunidades: a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade; b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã; c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil; d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional; e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA; f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso; Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados. Fotos acima.	

A1.1.4.: Fortalecimento da cadeia produtiva da farinha de mandioca a partir aquisição de novos equipamento e embalagens para produção de farinha artesanal.	
Status da execução da atividade: Finalizada	
Quantificação da execução (%): 100%	
Ações realizadas: Foram adquiridos 10 fornos de torrefação manual, 10 Balanças com bateria, 10 Seladoras Manual. Por conta do aumento os valores orçados das Caixas de água de 500L em fevereiro de 2020, não estão disponíveis no mercado pelo mesmo valor, sendo assim, a possibilidade de compra foi de apenas 9 unidades. A Comercialização de farinha de mandioca, após a consultoria realizada no primeiro semestre ajudou com as orientações repassadas aos produtores e como programado a atividade está em crescimento, no primeiro semestre foram produzidas 3,5 toneladas e nesse segundo semestre já ultrapassou as 3,0 toneladas totalizando 6,5 toneladas de farinha de mandioca tipo puba com preço médio de R\$9,00 o quilo pago ao produtor. Boa parte da comercialização é realizada no município de Aripuanã que há uma demanda crescente pelo produto devido a um fluxo de pessoas e os empreendimentos no município. Os equipamentos para produção foram adquiridos e entre no primeiro semestre conforme consta em relatório. A Comercialização de farinha de mandioca é uma das atividades consolidadas na Resex, gerando renda as famílias, após a consultoria realizada conforme consta no relatório anterior e com as orientações repassadas aos produtores a atividade está em crescimento totalizando no ano mais de 08 toneladas de farinha de mandioca tipo puba produzidas e comercializadas com preço médio de R\$ 9,00 o quilo pago ao produtor. Boa parte da comercialização é realizada no município de Aripuanã que há uma demanda crescente pelo produto devido a um fluxo de pessoas e os empreendimentos no município. O escritório da Pacto das Aguas através do projeto Biodiverso dá suporte de armazenamento e logística para entrega no comercio local, possibilitando sempre que necessário o abastecimento dos pontos comerciais parceiros do município.	
	
tacho diam. 1200 x 1500 x alt. 200 – aço carbono, chap 2,00 # 14 c/ 4 alça (peso aproximado 60 kg cada)	Tacho em transporte para Aripuanã-MT para o escritório da Pacto.



Entrega dos equipamentos no barracão da AMORARR



Entrega dos equipamentos no barracão da AMARR



Produção da farinha



Transporte de lote farinha para comercialização



Produção de farinha de mandioca



Produção de farinha de mandioca

	
Farinha pronta para comercialização	Pronta para comercialização
	
Transporte da produção	Transporte da produção
Resultados alcançados: Aumento na produção, padronização do produto e comercialização. Desafios/dificuldades encontradas: Logística de transporte no período chuvoso. Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Riscos: a. Ausência de demarcação física da Resex; b. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex; c. Efeitos negativos na economia global provocado pela Pandemia do COVID 19;	

d. Condições de estradas que dão acesso as comunidades para escoamento da produção;

Oportunidades:

- a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade;
- b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã;
- c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil;
- d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional;
- e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA;
- f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Fotos acima;

Anexo 2: Relatório casa da farinha.

A1.1.5.: Promover o aprimoramento das práticas de produção, formação preço e comercialização de artesanato produzido por mulheres a partir do uso sustentável dos recursos florestais não madeireiros.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

O objetivo geral da oficina foi atualização de práticas de produção de artesanato florestal produzido por mulheres e jovens moradores da Reserva Extrativista Guariba Roosevelt. Objetivos Específicos: a) Capacidade de melhoria de produtividade para aperfeiçoar a cadeia do artesanato, melhorando o processo de produção. b) Ampliar a renda dos moradores das comunidades extrativistas, melhorando assim as condições econômicas e sociais da população local; c) Fortalecer a Associação dos Moradores da Reserva Extrativista, melhorando a capacidade produtiva e organizacional e a autoconfiança da comunidade. A oficina foi realizada nos dias 27 e 28 setembro na comunidade São Gonçalo Reserva extrativista Guariba Roosevelt, no município de Colniza, no Estado do Mato Grosso e faz limites territoriais com os Estados de Rondônia e Amazonas nos perímetros da floresta amazônica meridional mato-grossense. Como parte do desenvolvimento foi realizada a oficina participativa com grupos de mulheres e jovens para aprendizado e troca de experiências da atividade de produção artesanal. A oficina participativa contou com a presença de 31 pessoas da comunidade, onde foram atualizadas as práticas sobre os procedimentos do artesanato. A metodologia de ensino foi de forma explicativa e expositiva dialogada com processo coletivo de construção participativa.



Foto 27: Preparando os materiais



Foto 28: As Anciãs repassando conhecimento

Resultados alcançados:

Troca de experiência das anciãs com os jovens, repasse de conhecimento tradicional. Participação de toda a comunidade que proporcionou passar o conhecimento tradicional das anciãs que estava se perdendo ao tempo.

Desafios/dificuldades encontradas:

Logística de transporte no período de seca via fluvial.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Riscos:

- a. Ausência de demarcação física da Resex;
- b. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex;
- c. Efeitos negativos na economia global provocado pela Pandemia do COVID 19;
- d. Condições de estradas que dão acesso as comunidades para escoamento da produção;

Oportunidades:

- a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade;
- b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã;
- c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil;
- d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional;
- e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA;
- f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Fotos acima;

Anexo 3: Relatório oficina de artesanato.

A1.1.6.: Construção de layout e aquisição de embalagens para comercialização de castanha em amêndoas e derivados. ATIVIDADE CANCELADA

Status da execução da atividade: Não iniciada

Quantificação da execução (%): 0%

Ações realizadas:

Essa atividade está no contexto do Arranjo produtivo local, que não ocorreu devido ao fechamento da cooperativa do Guariba – COMIGUA. Houve formalização do cancelamento e solicitação de remanejamento dos recursos que foram aprovados e estão relatados no 1º relatório.

Está no PGWEB o anexo do e-mail datado dia 15/07/2021 - com título: Re: Chamada 03.20 REM MT: comunicado - Pacto das águas.

Resultados alcançados:

Desafios/dificuldades encontradas:

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

A1.1.7.: Promoção do conhecimento e a reaplicação de tecnologia de baixo carbono com a realização de 1 curso de 50h, realizado em 02 etapas, com foco em SAFs com Cacau e Café, voltados para extrativistas da Resex, Pequenos agricultores da zona de amortecimento e técnicos da EMPAER e dos Municípios de Aripuanã e Colniza.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Em razão da situação política das eleições de 2022, criou-se um clima hostil na região da Resex Guariba Roosevelt gerando ameaças e provocações, as atividades que estavam a princípio de serem realizadas nessa região, foram direcionadas para a região de Juína MT, sendo primeira etapa realizada na aldeia Curva Terra Indígena Erikpatsa com a presença de jovens indígenas e jovens lideranças da Resex e na sequência a segunda etapa foi no campo experimental da Empaer Juina, onde puderam ver na prática a aplicação de tecnologias de baixo carbono – SAF's: café, cacau, castanha, banana, árvores nativas entre outras experiências - Conteúdo aplicado, fotos e listas de presenças em anexo. PROGRAMAÇÃO: Atividade realizada entre os dias 18 a 20 de outubro de 2022. Atividade A1.1.7- Promoção do conhecimento e a reaplicação de tecnologia de baixo carbono com a realização de 1 curso de 50h, realizado em 02 etapas,

com foco em SAFs com Cacau e Café, voltados para extrativistas da Resex, pequenos agricultores da zona de amortecimento e técnicos da EMPAER no Município de Juína. Sendo realizada a primeira etapa no com participação de representantes das Terras Indígenas Japuira e Erikbatsa e representantes da Resex Guariba Rooselvet, voltados para apresentação teórica e prática. - Visita técnica no Campo experimental da EMPAER, propriedades em torno do município de Juína que desenvolvem sistema agroflorestais, conversa com produtores e técnicos locais que desenvolvem essas atividades.



Dinâmica de grupo – interação Erikbatsa Resex



Dinâmica de grupo – interação Erikbatsa Resex



Visita a EMPAER Juina MT –SAF'S



Visita a EMPAER Juina MT –SAF'S



Visita a EMPAER Juina MT –SAF’S



Visita a EMPAER Juina MT –SAF’S

Resultados alcançados:

Interesse dos participantes de implantar novas culturas nas suas comunidades, participação dos jovens.

Desafios/dificuldades encontradas:

Devido ao clima hostil no entorno da Resex na época de eleição, foi necessária mudança de local e parte do público alvo.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Riscos:

- a. Ausência de demarcação física da Resex;
- b. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex;
- c. Efeitos negativos na economia global provocado pela Pandemia do COVID 19;
- d. Condições de estradas que dão acesso as comunidades para escoamento da produção;

Oportunidades:

- a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade;
- b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã;
- c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil;
- d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional;
- e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA;
- f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

ANEXO 4: Curso SAF's Atividade A1.1.7..pdf

A1.1.8.: Monitorar os níveis de aflatoxina da produção de castanha da Resex Guariba Roosevelt e indicar adequações de melhorias nas boas práticas aplicadas.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

A aquisição do Kit afla-zea para determinação de aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2) encontra-se em processo de finalização, pois o kit trata-se de produto importado. No caso dos reagentes para realização das análises laboratoriais, por se tratarem de produtos químicos para laboratório alguns são controlados pela Polícia Federal, sendo necessário ter Licença da mesma. Estamos verificando quais os procedimentos necessários para aquisição. No entanto, já foram separadas amostras das castanhas coletadas e enviadas para EMBRAPA AGROSSILVOPASTORIL, aos cuidados da Dr. Silvia de Carvalho Campos Botelho, para a realização de análise laboratoriais de Aflatoxina B1, B2, G1 e G2 para a EMBRAPA-SINOP. A atividade encontra-se em andamento pelo CENTRO DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO - EMBRAPA AGROSSILVOPASTORIL.

Segundo semestre: Pacto das Aguas não conseguiu finalizar as aquisições de compra dos kits Afla Zea para determinação de aflatoxinas, por burocracia de CNPJ, pois a empresa não poderia realizar a venda para a Pacto das Aguas, pois o CNPJ não possuía CNAI próprio para o uso destes componentes, e ao mesmo tempo não pudemos repassar o recurso para a EMBRAPA realizar a compra no CNPJ deles pois o projeto não permitia a transferência de recuso para a conta EMBRAPA. Portanto, a Embrapa fez as análises com os produtos de estoque deles. A Pacto pode remanejar o recurso que existia nesta rubrica, conforme carta de n. 045/2022 – datado em 06/12/2022



Coleta de amostras de castanha (Aizo Pereira dos santos, colocação Zé leiteiro – Rio Guariba)



Amostras de castanha do Brasil enviadas ao laboratório da EMBRAPA.

Resultados alcançados:

Análise parcialmente realizada em parceria com Embrapa Sinop. Foram realizadas análises parciais nos lotes de castanha, demonstrando que as boas práticas aplicadas contribuem para os níveis de aflatoxina estejam dentro dos parâmetros aceitáveis.

Desafios/dificuldades encontradas:

Produtos laboratoriais controlados, a instituição Pacto das Águas não obteve autorização para aquisição. A aquisição dos produtos reagentes não foi possível ser adquiridos pelo projeto pois são de controle dos órgãos de vigilância e necessita enquadrar nas normas estabelecidas. Porém a EMBRAPA fez as análises parciais com os seus reagentes.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):**Riscos:**

- a. Ausência de demarcação física da Resex;
- b. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex;
- c. Efeitos negativos na economia global provocado pela Pandemia do COVID 19;
- d. Condições de estradas que dão acesso às comunidades para escoamento da produção;

Oportunidades:

- a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade;
- b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã;
- c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil;
- d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional;
- e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA;
- f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

ANEXO 5: Resultado das amostragens

Objetivo específico A1.2.: Preparar as organizações sociais, para maior autonomia e sustentabilidade na gestão sócio produtiva da floresta.

A1.2.1.: Capital de giro para aquisição de matéria prima e formação de estoque de castanha, farinha de mandioca, copaíba e borracha nativa pelas Associações da Resex (AMARR e AMORARR)

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram realizadas as compras da matéria prima (Castanha, borracha e farinha) junto a Associação dos Moradores Agroextrativistas da Resex Guariba Roosevelt Rio Guariba. Nota Fiscal anexada ao sistema cérebro.

No dia 14/07/2021 foi realizado a transferência de compra para matéria prima para associação AMORARR no valor de R\$33.000,00 (trinta e três mil reais) e R\$9.000,00 (nove mil reais), no dia 15/07/2021 foi transferido mais R\$ 7.927,50 (sete mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos referente à compra matéria prima.

A Associação AMARR não recebeu o recurso destinado a ela por falta de atualização de sua inscrição estadual a tempo do encerramento do projeto, portanto o recurso destinado a ela foi remanejado para outras atividades conforme carta de n.045/2022 datado em 08/09/2022.

A outra parte que sobrou na rubrica de capital de giro no valor de R\$ 23.072,41 (vinte e três mil, setenta e dois reais e quarenta e um centavos) foi devolvido juntamente com o saldo final do projeto.

Resultados alcançados:

Repasse do capital de giro o que possibilitou a comercialização da produção e o pagamento aos extrativista no ato da entrega.

Desafios/dificuldades encontradas:

Regularização dos documentos das associações para emissão de notas fiscais junto Secretaria de Fazenda.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Riscos:

- a. Ausência de editais para apoio a pequenos projetos de organizações comunitárias no período de desenvolvimento do projeto;
- b. Disponibilidade de recursos nos programas e políticas públicas voltadas para agricultura familiar e sociobiodiversidade;
- c. Recuperação do preço de mercado para castanha em amêndoas e subprodutos;
- d. Instabilidade do mercado da castanha;

Oportunidades:

- a. Demanda dos mercados institucionais nos Municípios de Aripuanã e Colniza;
- b. Agregação de valor a cadeia produtiva da castanha do Brasil;
- c. Fortalecer uma aliança local entre extrativistas, pequenos e gestores municipais para o desenvolvimento sustentável, geração de renda e proteção da Resex Guariba Roosevelt;
- d. Criação e comercialização de subprodutos a partir da amêndoa da castanha-do-brasil;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Relatório e notas fiscais apresentados no 1º Relatório semestral aprovado.

A1.2.2.: Apoio institucional para manutenção de regularidade documental, fiscal e contábil de 02 associações da Resex e 01 cooperativa de pequenos agricultores.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

A equipe do projeto Biodiverso vem apoiando através de assessoria, assistência, auxílio, acompanhamento e transporte, bem como o desenvolvimento das atividades para o bom andamento do projeto, como: Apoio de transporte logístico da farinha para sede do município de Aripuanã, Distrito de Guariba e município de Colniza. Apoio à comercialização através de contatos aos mercados locais e regionais para venda da farinha. Acompanhamento do diálogo com a empresa VERT/VEJA na aquisição da produção da borracha, através de definição de estratégias de produção, embarque e transporte, elaboração e formatação de contrato e suporte das demandas junto as associações. Foram anexados ao sistema o Contrato de fornecimento de borracha natural de origem sustentável tipo cvp e pagamento por serviços socioambientais – pssa e nota fiscal entre a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA RESEX GUARIBA-ROOSEVELT, RIO GUARIBA-AMORARR, a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre – COOPERACRE, e a empresa V. FAIR TRADE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA., sendo que o presente contrato comercial está inserido dentro da filosofia do comércio justo, dentro dos princípios de cooperação e diálogo entre as partes, promovendo uma parceria equilibrada em benefício de grupos de produtores extrativistas de borracha NATIVA e DE CULTIVO, e de consumidores solidários. Acompanhamento do diálogo com a empresa KAAPI Fragrâncias (Campinas/SP) na aquisição da produção do óleo de copaíba, através do suporte junto as associações para definição de estratégias de produção, volume a ser comercializado, calendário de entrega e reuniões *on line* conjunto a associação e empresa Coleta de amostras nas colocações do Rio Guariba e Rio Roosevelt do óleo de copaíba para envio a empresa. Apoio a associação AMARR na atualização documental (registro de Ata em cartório, renovação certificado digital A3 e atualização conta bancária). Foram realizadas no semestre pelo projeto assessoria e alimentação para apoio a AMORARR, AMARR na realização de suas assembleias gerais ordinárias e extraordinárias para construção de planejamentos, prestação de conta, discussão de projetos, alterações de diretores, estatuto social e capacitações diversas. Capacitação de Inclusão Digital Rural Básico, realizada pelo SENAI através da Prefeitura Municipal de Colniza e Sindicato Rural, nas datas de 31/05 a 04/06 e segunda fase realizadas na data de 16/08 a 20/08 de 2021, com apoio de transporte e alimentação realizada pelo projeto Biodiverso. Foram realizadas visitas técnicas para monitoramento das boas práticas de produção, distribuição de materiais para apoio a safra de castanha, distribuição de materiais para apoio a safra de Borracha. Atualização de cadastro dos produtores de borracha, copaíba, farinha de mandioca, castanha do Brasil, e levantamento de demandas de materiais para safra 2021; Coleta de amostras de castanha

para análise das aflatoxinas. Cadastro a campo dos produtores de borracha, copaíba, farinha de mandioca, castanha do Brasil da Resex para Sistema GPWEB - REM; Apoio à comercialização através de contatos aos mercados locais e regionais para venda da farinha. Acompanhamento do diálogo com a empresa VERT/VEJA na aquisição da produção da borracha, através de definição de estratégias de produção, embarque e transporte, elaboração e formatação de contrato e suporte das demandas junto as associações. Contrato de fornecimento de borracha natural de origem sustentável tipo cvp e pagamento por serviços socioambientais. Acompanhamento das associações para estarem em conformidade com suas CNDs, estatutos, atas, registros financeiros e contábeis. No mês de agosto de 2022 o projeto contribui na organização, logística da reunião e assembleia de eleição e posse de representantes da AMORARR conforme ata enviada. No mês de agosto de 2022 o projeto contribui na organização, logística da reunião e assembleia de eleição e posse de representantes da AMARR. Acompanhamento do diálogo com a empresa VERT/VEJA na aquisição da produção da borracha, através de definição de estratégias de produção, embarque e transporte, elaboração e formatação de contrato e suporte das demandas junto as associações. Contrato de fornecimento de borracha natural de origem sustentável tipo cvp e pagamento por serviços socioambientais – passa e nota fiscal entre a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA RESEX GUARIBA-ROOSEVELT, RIO GUARIBA-AMORARR, a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre – COOPERACRE, e a empresa V. FAIR TRADE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA., sendo que o presente contrato comercial está inserido dentro da filosofia do comércio justo, dentro dos princípios de cooperação e diálogo entre as partes, promovendo uma parceria equilibrada em benefício de grupos de produtores extrativistas de borracha NATIVA e DE CULTIVO, e de consumidores solidários. Acompanhamento do diálogo com a empresa KAAPI Fragrâncias (Campinas/SP) na aquisição da produção do óleo de copaíba, através do suporte junto as associações para definição de estratégias de produção, volume a ser comercializado, calendário de entrega e reuniões *on line e presenciais* conjunto a associação e empresa. Coleta de amostras nas colocações do Rio Guariba e Rio Roosevelt do óleo de copaíba para envio a empresa. Realização de oficina com a participação de representante da empresa Apoio a associação AMARR na atualização documental (registro de Ata em cartório, renovação certificado digital A3 e atualização conta bancária). Também está programada para esse segundo semestre ao final da safra de seringa o apoio para realização das assembleias das associações conforme realizado no primeiro semestre pelo projeto através de assessoria e fornecimento alimentação para AMORARR, AMARR na realização de suas assembleias gerais ordinárias e extraordinárias para construção de planejamentos, prestação de conta, discussão de projetos, alterações de diretores, estatuto social e capacitações diversas. Participação das associações na Feira do Empreendedor que foi realizada no município de Aripuanã no dia 11 de dezembro de 2022, há associações possibilitou a apresentação dos produtos tradicionais e trabalhos confeccionados na oficina de artesanato, e também contados com possíveis parceiros e prospecção de mercado futuro para os produtos da Resex. Atividades cotidianas do projeto: Foram realizadas visitas técnicas para monitoramento das boas práticas de produção, distribuição de materiais para apoio a safra de castanha, distribuição de materiais para apoio a safra de Borracha. Atualização de cadastro dos produtores de borracha, copaíba, farinha de mandioca, castanha do Brasil, e levantamento de demandas de materiais para safra 2022; Coleta de amostras de castanha para análise das aflatoxinas que está sendo realizadas pela EMBRAPA, resultados serão apresentados relatório final.



Registro e assinatura da ATA da Associação




Assessoria fornecida pela equipe do projeto



Capacitação de Inclusão Digital Rural Básico, SENAI/Prefeitura de Colniza/Sindicato Rural.



Capacitação de Inclusão Digital Rural Básico, SENAI/Prefeitura de Colniza/Sindicato Rural.

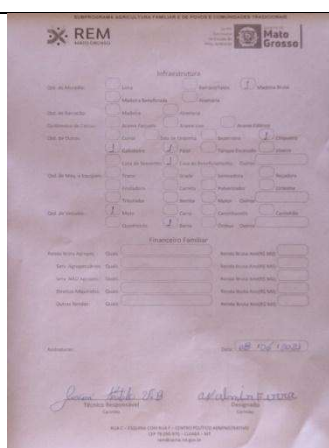

Fichas Resex GPweb



Amostra de óleo de copaíba



Apresentação teórica e da proposta da empresa



**Roda de conversa com representante da empresa e
copaibeiros**



Exposição dos produtos



Exposição dos produtos

 7 de dezembro de 2021 -10°10'32,81654"S -59°27'11,8258"W R. Seringueiros, 569, Aripuanã - MT, 78325-000, Brasil	 7 de dezembro de 2021 -10°10'32,70142"S -59°27'11,90878"W Av. Dois de Dezembro, 779, Aripuanã - MT, 78325-000, Brasil
Produtor (Teca) verificando embalagens para comercialização	Embalando e rotulando os produtos

b) 100 mil reais acessados de fontes não reembolsáveis ou de políticas e programas de apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar e sociobiodiversidade (PAA, PNAE e PGPMBio);

1) Contrato aprovado junto ao Fundo Socioambiental – CASA
Organização: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA RESEX GUARIBA ROOSEVELT RIO GUARIBA
Título do projeto: TERRITÓRIO DE RESILIÊNCIA
Número do Apoiado: EM CC 51/2021
Valor do Projeto: R\$ 30.000,00
Documento anexo.

2) Contrato aprovado junto ao Fundo Socioambiental – CASA
Organização: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA RESEX GUARIBA ROOSEVELT RIO ROOSEVELT
Título da Proposta: “PROJETO BRIGADA JOVEM”
Quantia solicitada ao Fundo Socioambiental CASA: R\$ 30.000,00

Elaboração, acompanhamento e apoio do PROJETO BRIGADA JOVEM realizado nas datas de 05/08 a 07/08 de 2021, realizada pelo Corpo de Bombeiros do município de Cuiabá, que tem como proposta, a promoção de ações de monitoramento, capacitação e conscientização sobre os riscos e danos das queimadas para preservação do ambiente e para saúde humana no território da Reserva Estadual Extrativista Guariba-Roosevelt e na área de amortecimento do Distrito de Guariba. Tendo como foco, a mobilização e capacitação de jovens lideranças para que as mesmas possam desempenhar disseminar voluntariamente, as orientações legais sobre o uso do fogo, bem como, orientar sobre as boas práticas existentes para evitar os incêndios descontrolados.

Foram capacitados 15 jovens para atuarem voluntariamente como brigadistas no território da Resex e em área de amortecimento, fortalecendo as capacidades técnicas de jovens lideranças e apoio a disseminação do conhecimento.



Capacitação teórica Brigada Jovem



Capacitação Brigada Jovem



Capacitação campo Brigada Jovem



Capacitação campo Brigada Jovem



Capacitação campo Brigada Jovem



Capacitação teórica realizada pelo Corpo de Bombeiros



Capacitação campo Brigada Jovem



Final da capacitação do curso.

Resultados alcançados:

Regularização das associações, acesso a projeto, participações em feiras, capacitações de jovens brigadistas.

Desafios/dificuldades encontradas:

Documentação dos associados para participação diretoria das associações, distancia cartórios, logística de transporte.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Riscos:

- Ausência de editais para apoio a pequenos projetos de organizações comunitárias no período de desenvolvimento do projeto;
- Disponibilidade de recursos nos programas e políticas públicas voltadas para agricultura familiar e sociobiodiversidade;

- c. Recuperação do preço de mercado para castanha em amêndoas e subprodutos;
- d. Instabilidade do mercado da castanha;

Oportunidades:

- a. Demanda dos mercados institucionais nos Municípios de Aripuanã e Colniza;
- b. Agregação de valor a cadeia produtiva da castanha do Brasil;
- c. Fortalecer uma aliança local entre extrativistas, pequenos e gestores municipais para o desenvolvimento sustentável, geração de renda e proteção da Resex Guariba Roosevelt;
- d. Criação e comercialização de subprodutos a partir da amêndoa da castanha-do-brasil;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Fotos acima,

Relatório, lista de presença e fotos apresentados no 2º relatório semestral aprovado.

A1.2.3.: Formalização de um Arranjo Produtivo Local- APL e aquisição de equipamentos para melhoria e potencialização dos processos de beneficiamento de castanha-do-brasil. ATIVIDADE CANCELADA

Status da execução da atividade: Não iniciada

Quantificação da execução (%): 0%

Ações realizadas:

O arranjo local seria com Cooperativa COMIGUA, e durante o período do projeto entrou em falência fechando as portas. Cooperativa Mista do Guariba-Comigua, instituição prevista para a composição do APL (Arranjo Produtivo Local), encontra-se com problemas graves na sua estrutura de produção, além de pendências fiscais e tributárias, o que inviabiliza a construção do APL, e por consequência todas as demais atividades a ele vinculadas, trazendo assim impactos nos resultados do projeto.

O cancelamento da atividade foi aprovado em 15/07/2021, pelo Funbio.

Resultados alcançados:

Desafios/dificuldades encontradas:

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

A1.2.4.: Consultoria em produtos digitais para criação de 01 site para 02 associações da Resex e ajuste das páginas de redes sociais. ATIVIDADE CANCELADA E REMANEJADA

Status da execução da atividade: Não iniciada

Quantificação da execução (%): 0%

Ações realizadas:

O agravamento da pandemia com curva crescente de casos de Covid-19 em todo o Estado de Mato Grosso, com o registro de óbitos passando de cem por dia, além dos vários decretos instaurando restrições de circulação e aglomeração tanto em âmbito estadual como nos municípios que a Resex está inserida, trouxeram um cenário em que a realização de atividades de capacitação neste momento, torna-se inviável, devido a prevenção dos riscos de disseminação do corona vírus (COVID- 19), conforme legislação estadual em vigor.

O cancelamento da atividade foi aprovado em 15/07/2021, pelo Funbio.

Resultados alcançados:
Desafios/dificuldades encontradas:
Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

A1.2.5.: Realizar 01 oficina de 24h em Marketing Digital para 10 jovens associados para que sejam preparados para alimentar adequadamente as redes sociais, bem como fazerem a atualização e manutenção de conteúdo do site, de modo a tornas as Associações mais autônomas na manutenção de suas ferramentas de comunicação com o mercado. ATIVIDADE CANCELADA E REMANEJADA

Status da execução da atividade: Não iniciada

Quantificação da execução (%): 0%

Ações realizadas:

O agravamento da pandemia com curva crescente de casos de Covid-19 em todo o Estado de Mato Grosso, com o registro de óbitos passando de cem por dia, além dos vários decretos instaurando restrições de circulação e aglomeração tanto em âmbito estadual como nos municípios que a Resex está inserida, trouxeram um cenário em que a realização de atividades de capacitação neste momento, torna-se inviável, devido a prevenção dos riscos de disseminação do corona vírus (COVID- 19), conforme legislação estadual em vigor.

O cancelamento da atividade foi aprovado em 15/07/2021, pelo Funbio.

Resultados alcançados:
Desafios/dificuldades encontradas:

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Objetivo específico A1.3.: Desenvolver a gestão, a governança e a disseminação dos conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável para os povos da floresta.

A1.3.1.: Contratação de recursos humanos para atuação no desenvolvimento da gestão administrativa, financeira e contábil do projeto, bem como para o desenvolvimento das atividades técnicas e consultorias previstas.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Recursos humanos contratados para atuação no desenvolvimento técnico, financeiro e administrativo do projeto:

Joao Manoel de Souza Peres - Pacto das Águas - Coordenador Técnico

Everaldo Dutra dos Santos - Pacto das Águas – Assessor Institucional

Geovane Apostolo Vilas Boas - Técnico de Campo

Veronece Machado de Araújo - Pacto das Águas - Auxiliar Administrativo Financeiro

Rosimar Braga - Pacto das Águas – Tesoureira Pacto das Águas - Coordenação Financeira

Resultados alcançados:

Equipe técnica formada com experiência.

Desafios/dificuldades encontradas:

Logística de transporte condições de estrada. O agravamento da pandemia com curva crescente de casos de Covid-19 em todo o Estado de Mato Grosso, com o registro de óbitos passando de cem por dia, além dos vários decretos instaurando restrições de circulação e aglomeração tanto em âmbito estadual como nos municípios que a Resex está inserida, trouxeram um cenário em que a realização de atividades de capacitação neste momento, torna-se inviável, devido a prevenção dos riscos de disseminação do Corona vírus (COVID- 19), conforme legislação estadual em vigor.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Riscos:

- a. Corte de recurso no orçamento do governo Federal, estadual ou municipais devido à pandemia da COVID-19, inviabilizando as discussões de possíveis parcerias;
- b. Aumento do desmatamento e conflitos agrários no entorno da Resex Guariba- Roosevelt;
- c. Falta de funcionamento do Conselho Deliberativo da Resex;

Oportunidades:

- a. Equipe com capacidade técnica e conhecimento dos desafios regionais e experiência de trabalho com as comunidades tradicionais;
- b. Parcerias institucionais já estabelecidas com a EMBRAPA para desenvolvimento de ações no âmbito do projeto;
- c. Possibilidade de cooperação com municípios de Aripuanã, Colniza para garantir a continuidade das ações do projeto após encerramento;
- d. Realização de termos de cooperação com instituição de ensino, pesquisa e extensão rural (IFMT, UNEMAT, CEPLAC e EMPAER) para potencializar as ações do projeto e ampliar o atendimento a outras comunidades do entorno da Resex;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Contratos inseridos no Cérebro e evidências no 1º relatório semestral aprovado.

A1.3.2.: Apoio a manutenção de um escritório regional de suporte a equipe técnica do projeto.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram anexados os comprovantes no sistema Cérebro das despesas administrativas (água, luz, telefone, internet, tarifas bancárias, correios, cartórios, fretes, materiais de limpeza e higienização), materiais de papelaria e informática para escritório, combustível para abastecimento de carro, moto e barcos utilizados no desenvolvimento de assistência técnica, assembleias das associações. Manutenção de 02 veículos de apoio ao Projeto e diárias de apoio a equipe técnica, colaboradores eventuais e comunitários envolvidos nas atividades previstas no projeto. IPVA de 02 veículo (02 carros e 01 moto) de uso do projeto e apoio as comunidades. Emplacamento e licenciamento anual de 02 veículos e 01 moto de uso do projeto e apoio as comunidades e seguros para 02 veículos.

Resultados alcançados:

Escritório montado funcionando possibilitou condições adequadas de trabalho a equipe.

Desafios/dificuldades encontradas:

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Riscos: a. Corte de recurso no orçamento do governo Federal, estadual ou municipais devido à pandemia da COVID-19, inviabilizando as discussões de possíveis parcerias; b. Aumento do desmatamento e conflitos agrários no entorno da Resex Guariba- Roosevelt; c. Falta de funcionamento do Conselho Deliberativo da Resex; Oportunidades: a. Equipe com capacidade técnica e conhecimento dos desafios regionais e experiência de trabalho com as comunidades tradicionais; b. Parcerias institucionais já estabelecidas com a EMBRAPA para desenvolvimento de ações no âmbito do projeto; c. Possibilidade de cooperação com municípios de Aripuanã, Colniza para garantir a continuidade das ações do projeto após encerramento; d. Realização de termos de cooperação com instituição de ensino, pesquisa e extensão rural (IFMT, UNEMAT, CEPLAC e EMPAER) para potencializar as ações do projeto e ampliar o atendimento a outras comunidades do entorno da Resex; Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados. Comprovantes de pagamentos pessoais e despesas inserido no sistema cérebro.
--

A1.3.3.: Produção de conteúdos comunicação para divulgação e disseminação das experiências do projeto.
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: A princípio estava programada a confecção de calendários, porém com entendimento entre as partes foram confeccionadas agendas.

- a. Corte de recurso no orçamento do governo Federal, estadual ou municipais devido à pandemia da COVID-19, inviabilizando as discussões de possíveis parcerias;
- b. Aumento do desmatamento e conflitos agrários no entorno da Resex Guariba- Roosevelt;
- c. Falta de funcionamento do Conselho Deliberativo da Resex;

Oportunidades:

- a. Equipe com capacidade técnica e conhecimento dos desafios regionais e experiência de trabalho com as comunidades tradicionais;
- b. Parcerias institucionais já estabelecidas com a EMBRAPA para desenvolvimento de ações no âmbito do projeto;
- c. Possibilidade de cooperação com municípios de Aripuanã, Colniza para garantir a continuidade das ações do projeto após encerramento;
- d. Realização de termos de cooperação com instituição de ensino, pesquisa e extensão rural (IFMT, UNEMAT, CEPLAC e EMPAER) para potencializar as ações do projeto e ampliar o atendimento a outras comunidades do entorno da Resex;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Anexo 5: Produção de conteúdo.

A1.3.4.: Aquisição de equipamentos permanentes para apoio ao desenvolvimento do projeto

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram adquiridos pelo projeto 01 Câmera para registro fotográfico das atividades, 01 projetor Data Show, 02 notebooks. Estes equipamentos foram adquiridos via internet, pois conforme verificado nas lojas da região, os valores encontrados são maiores que os previstos e também menor oferta de produtos. Estava previsto a aquisição de 01 veículo do tipo passeio para dar suporte as atividades do projeto junto à comunidade da Resex Guariba Roosevelt. No entanto, conforme pesquisa realizada, reunião da equipe e consulta ao FUNBIO e resposta enviada dia 08 de janeiro de 2021, foram adquiridos 02 veículos utilitários de menor porte, não havendo a necessidade de remanejamento de recurso. A justificativa se deve ao fato de que ao elaborar o projeto Biodiverso a equipe considerou que o início das atividades se daria com uma margem de tempo segura para início da safra de castanha na reserva extrativista, isso nos permitiria realizar as reuniões de planejamento e entrega de insumos antes da coleta da castanha. Com a chegada da pandemia e o consequente adiamento dos prazos de início do projeto fez com que fosse necessário realizar as atividades durante a safra, soma-se a isso, o fato de que, por conta de ajuste no percentual do primeiro desembolso o caminhão previsto para aquisição teve que ser alocado para o segundo desembolso, ou seja, após a safra. O recurso previsto para aquisição de veículo nos permitiu adquirir, após autorização, duas pick ups 4x2 utilitárias, nos permitindo agilizar as atividades, não havendo a necessidade de remanejamento de recurso.

Resultados alcançados:

Equipamentos e veículos adquiridos.

Desafios/dificuldades encontradas:

Manutenção de veículos periódica devido as condições de logística estrada.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):**Riscos:**

- a. Corte de recurso no orçamento do governo Federal, estadual ou municipais devido à pandemia da COVID-19, inviabilizado as discussões de possíveis parcerias;
- b. Aumento do desmatamento e conflitos agrários no entorno da Resex Guariba- Roosevelt;
- c. Falta de funcionamento do Conselho Deliberativo da Resex;

Oportunidades:

- a. Equipe com capacidade técnica e conhecimento dos desafios regionais e experiência de trabalho com as comunidades tradicionais;
- b. Parcerias institucionais já estabelecidas com a EMBRAPA para desenvolvimento de ações no âmbito do projeto;
- c. Possibilidade de cooperação com municípios de Aripuanã, Colniza para garantir a continuidade das ações do projeto após encerramento;
- d. Realização de termos de cooperação com instituição de ensino, pesquisa e extensão rural (IFMT, UNEMAT, CEPLAC e EMPAER) para potencializar as ações do projeto e ampliar o atendimento a outras comunidades do entorno da Resex;

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Documentos e notas inseridos no sistema cérebro.

SEÇÃO 2

Esta seção deve conter informações relativas ao período total de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

1. Resumo Executivo

O PROJETO BIODIVERSO, atuou com o objetivo de consolidar alternativas de geração de renda, fortalecimento organizacional, produção e desenvolvimento sustentável para seringueiros da Reserva Estadual Extrativista Guariba-Roosevelt. Buscou prioritariamente a valoração da floresta e dos produtos da sociobiodiversidade, do artesanato e do agroextrativismo, e proporcionou o aumento do poder aquisitivo de bens e serviços adquiridos pelas comunidades, gerando impactos econômicos positivos a economia familiar e aumentando sua resiliência no território. Possibilitou o estímulo para a geração de renda e o desenvolvimento sustentável, por meio do apoio a produção e a agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade e do agroextrativismo comunitário da Resex, estes personagens hoje são indutores econômicos para os demais povos da região e cada vez mais o desenvolvimento de atividades de geração de renda sustentável em suas áreas e desenvolvidas no âmbito deste projeto. Para que isso fosse possível, foi preciso fortalecer e preparar as organizações sociais, para maior autonomia e sustentabilidade na gestão sócio produtiva da floresta. Consolidando a viabilização e a participação desses produtos nos mercados institucionais da região, levando alimento saudável, nutritivo e quebrando barreiras de preconceitos para com a comunidade extrativista.

Não obstante destes avanços, o projeto buscou desenvolver a gestão, a governança e a disseminação dos conhecimentos gerados, como uma forma de atrair novos parceiros, qualificar e acompanhar as organizações e consolidar uma aliança regional de desenvolvimento sustentável, que seja norteada pelos interesses comuns de seringueiros e agricultores na preservação florestal em pé, segurança alimentar e produtiva e a geração de coo benefícios gerados.

2. Contextualização

A região Noroeste de Mato Grosso (Figura 2) está totalmente inserida no bioma Amazônia, possui uma área de aproximadamente 108 mil quilômetros quadrados e está localizada no “arco do desmatamento”. É composta por sete municípios: Aripuanã, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Juruena e Rondolândia. Sua população total é de 120 mil habitantes, dos quais aproximadamente 38% vivem em áreas rurais. Essa região sofre uma série de pressões ambientais, advindas principalmente dos processos migratórios que atraíram e mantiveram na região grupos sociais distintos – como garimpeiros, latifundiários, extrativistas, indígenas, assentados, comerciantes – que não possuem interesses econômicos e políticos convergentes. A história de região é marcada pela exploração desordenada dos recursos naturais, com impactos sociais e ambientais profundos. A lógica comercial predominante é exploratória e põe em risco a manutenção dos serviços ambientais fornecidos pela floresta.

Segundo a Análise do Desmatamento da Amazônia Mato-grossense, do Instituto Centro de Vida (ICV) áreas protegidas da região funcionam como um freio a essa expansão. Do total de desmatamento no Noroeste, apenas 1,2% ocorre nas áreas protegidas sendo, desse percentual, 1,1% de terras indígenas e 0,1% em unidades de conservação. Mas a ameaça de expansão agropecuária e os projetos de empreendimentos de geração de energia na região trazem preocupação constante para os indígenas e seringueiros, públicos com os quais a Pacto das Águas trabalha há anos.

A Pacto das Águas acredita que o extrativismo legal e sustentável que valoriza a floresta em pé é uma eficaz estratégia de gestão ambiental e territorial. Ele possibilita a geração de renda para o sustento das famílias e comunidades, valorizando os modos de vida tradicionais e seu protagonismo social. A organização

trabalha para garantir alternativas de geração de renda às comunidades indígenas e extrativistas, apoiando a estruturação das cadeias de produtos da sociobiodiversidade que as comunidades já utilizam e de outros potenciais existentes em suas terras.

Sabemos, por experiência, que no que se refere à geração de renda, esses povos convivem com uma disputa de modelos. De um lado, um modelo dominante, apoiado em um número significativo de recursos e políticas públicas que privilegiam a expansão agropecuária, as atividades madeireiras e minerais e obras de infraestrutura – todas atividades que resultam em supressão da floresta e geram pouco desenvolvimento local. Um estudo do Mosaico da Amazônia Meridional de 2013 do Imazon mostrou que o processo de boom e colapso que tem sido a regra na Amazônia há décadas não se sustenta economicamente e gera apenas 8% do PIB nacional.

De outro, um modelo pautado pelo uso responsável da biodiversidade, praticado em toda a Amazônia, que privilegia e fortalece a coesão social entre os grupos extrativistas, suas identidades culturais, bem como mecanismos de gestão ambiental e territorial de suas áreas, com produtos como o açaí, a castanha-do-brasil, a borracha natural, o babaçu e outros. Para a economia extrativista, no entanto, há pouco investimento público e fomento a suas cadeias produtivas, ausência de assistência técnica e de assessoria para a gestão de negócios comunitários sustentáveis.

3. Metodologia

Como a Pacto das Águas, entre 2013 e 2017 desenvolvemos um projeto de incentivo ao manejo comunitário da castanha-do-brasil e da borracha, patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental. O projeto envolveu os seringueiros da Resex Guariba-Roosevelt, bem como os povos Cinta Larga da Terras Indígena Serra Morena e Parque Indígena Aripuanã, os Rikbaktsa da Terra Indígena Japuira, e os seringueiros da Reserva Extrativista Guariba- Roosevelt.

Nossa metodologia de trabalho foi reconhecida em 2015 pela Fundação Banco do Brasil como Tecnologia Social e certificada como prática ambiental no Prêmio Gestão Ambiental no Bioma Amazônia em 2016, iniciativa do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam). Habilitada em 2016 na 17ª (décima sétima) posição de um ranking de 61 iniciativas ao Prêmio Boas Práticas de Gestão Ambiental - Bioma Amazônia do Instituto Brasileiro de Administração na Categoria: Produção sustentável e incentivos destinados à conservação.

Em 2018 e 2019, a Pacto das Águas executou uma nova fase do projeto, também com patrocínio da Petrobras, para consolidar as cadeias produtivas de castanha-do-brasil e borracha natural, dois produtos que são a base da economia das comunidades tradicionais da região. Além da Resex Guariba-Roosevelt, essa segunda fase envolveu as Terras Indígena Japuira e Escondido, do povo Rikbaktsa.

Desenvolver atividades produtivas sustentáveis que permitam a conservação ambiental é uma estratégia relevante para reduzir as taxas de desmatamento, que voltaram a subir desde 2012 na Amazônia, e propiciar alternativas de geração de renda e vida digna para os povos da floresta, respeitando sua cultura e modos de vida tradicionais e, ainda beneficiando todo o planeta.

4. Resultados alcançados pelo Projeto:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
A1.1-Esperamos que no desenvolvimento das atividades desse objetivo possamos alcançar os seguintes resultados: a. Produção de 50 toneladas de castanha, 15 toneladas de borracha e 01 tonelada de óleo de copaíba com práticas de produção padronizadas e com assistência técnica periódica; b. 70 extrativistas capacitados para desenvolverem suas atividades produtivas de forma padronizadas e em conformidade normas ambientais e sanitárias; c. Sistema de transporte implementado e operando para redução dos custos	A1.1.1-Compra e fornecimento de utensílios e combustíveis para apoio ao manejo e transporte de borracha nativa, castanha da Amazônia e copaíba. A1.1.2-Consultoria para realizar oficina de padronização das boas pratica de produção de borracha e óleo de copaíba; A1.1.3- Estruturação do sistema de transporte da Resex Guariba Roosevelt para dar suporte as atividades produtivas e econômicas de castanha, borracha, copaíba, farinha de mandioca e agricultura. A1.1.4-Fortalecimento da cadeia produtiva da farinha de mandioca a partir aquisição de novos equipamento e embalagens para produção de farinha artesanal A1.1.5-Promover o aprimoramento das práticas de produção, formação preço e comercialização de artesanato produzido por mulheres a partir do uso sustentável dos recursos florestais não madeireiros A1.1.6 REMANEJADA A1.1.7-Promoção do conhecimento e a reaplicação de tecnologia de baixo carbono com	Quantidade produzida e comercializada durante a execução do projeto Total de extrativistas capacitados em boas práticas de produção de borracha e copaíba. Notas fiscais ou outros instrumentos de compra e venda, firmados no âmbito das associações. Quantidade produzida e comercializada durante a execução do projeto Total de mulheres capacita e número de feiras ou encontros participados. Atendimento aos padrões e normas sanitárias. Cancelada Total de agricultores, extrativistas e técnicos dos municípios de Aripuanã e Colniza capacitados.	Produção castanha do Brasil 53, 5 toneladas Produção CVP 15 toneladas Produção farinha de mandioca 10 toneladas Óleo de copaíba 500 kg Participação de 73 famílias A1.1.1 – 100% (cem por cento) realizada A1.1.2- 100% (cem por cento) realizada A1.1.3- - 100% (cem por cento) realizada A1.1.4 – 100% (cem por cento) realizada A1.1.5 - 100% (cem por cento) realizada A1.1.6 - REMANEJADA

logísticos e ampliação da capacidade de atendimento dos mercados formais e institucionais dos municípios de Aripuanã e Colniza; d. Produção e comercialização de 5 toneladas de farinha de mandioca; e. 35 mulheres capacitadas; f. Participação em 03 feiras de artesanatos ou encontros com temática do gênero; g. Adequação e padronização de embalagens de acordo com normas sanitárias; h. 40 agricultores, extrativistas e técnicos capacitados; i. 150 análises de aflatoxina realizadas.	a realização de 1 curso de 50h, realizado em 02 etapas, com foco em SAFs com Cacau e Café, voltados para extrativistas da Resex, Pequenos agricultores da zona de amortecimento e técnicos da EMPAER e dos Municípios de Aripuanã e Colniza. A1.1.8-Monitorar os níveis de aflatoxina da produção de castanha da Resex Guariba Roosevelt e indicar adequações de melhorias nas boas práticas aplicadas.	Número de análises realizadas	A1.1.7 - 100% (cem por cento) realizada - A1.1.8 - Realizada parcialmente conforme consta em relatório
A1.2- As atividades a serem desenvolvidas	A1.2.1-Capital de giro para aquisição de matéria prima e	Total de toneladas de produtos do agro	A1.2.1 – 50% realizada, repasse

nesse objetivo levarão ao alce dos resultados: a. Compra e formação de estoque de 20 toneladas de produtos do agroextrativismo da Resex; b. R\$ 100 mil acessados de fontes não reembolsáveis ou de políticas e programas de apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar e sociobiodiversidade (PAA, PNAE e PGPMBio); c. 10 toneladas de amêndoas beneficiadas e comercializadas no âmbito do APL. d. 01 Site criado e páginas de redes sociais das associações atualizadas com os produtos da sociobiodiversidade, artesanato e do agroextrativismo, bem como	formação de estoque de castanha, farinha de mandioca, copaíba e borracha nativa pelas Associações da Resex (AMARR e AMORARR); A1.2.2-Apoio institucional para manutenção de regularidade documental, fiscal e contábil de 02 associações da Resex e 01 cooperativa de pequenos agricultores. A1.2.3-Formalização de um Arranjo Produtivo Local- APL e aquisição de equipamentos para melhoria e potencialização dos processos de beneficiamento de castanha-do-brasil. - Remanejada A1.2.4-Consultoria em produtos digitais para criação de 01 site para 02 associações da Resex e ajuste das páginas de redes sociais; A1.2.5-Realizar 01 oficina de 24h em Marketing Digital para 10 jovens associados para que sejam preparados para alimentar adequadamente as redes sociais, bem como fazerem a atualização e manutenção de conteúdos do site, de modo a tornas as Associações mais autônomas na	extrativismo adquiridos pelas associações. Volume de recursos acessados em projetos, políticas e programas (PAA, PNAE e PGPMBio); Total de produção beneficiada e comercializada por meio do APL. Site e redes sociais atualizadas. Total de jovens capacitados em Marketing Digital	para AMORRAR, conforme consta relatório – No relatório consta os resultados das análises parcial, A1.2.2 - 100% (cem por cento) realizada A1.2.3- REMANEJADA A1.2.4 - REMANEJADA A1.2.5 – REMANEJADA O agravamento da pandemia com curva crescente de casos de Covid-19 em todo o Estado de Mato Grosso, com o registro de óbitos passando de cem por dia, além dos vários decretos instaurando restrições de circulação e aglomeração tanto em âmbito estadual como nos municípios que a Resex está inserida, trouxeram um cenário em que a
---	--	---	--

informações sobre a importância ecológica da Resex para reforçando o valor socioambiental; e. 10 Jovens capacitados em Marketing Digital para operacionalização do site e das redes sociais das associações	manutenção de suas ferramentas de comunicação com o mercado.		realização de atividades de capacitação neste momento, torna-se inviável, devido a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus (COVID- 19), conforme legislação estadual em vigor.
A1.3-Busca-se por meio deste objetivo, dar suporte ao desenvolvimento das atividades dos demais objetivos na busca pelos seguintes resultados: a. 230 produtores acompanhados pela assistência técnica para aplicação das boas práticas de produção de castanha, borracha, copaíba e farinha de mandioca; b. 03 empreendimentos comunitários (02 Associações da Resex 01 Cooperativa de Agricultores da área	A1.3.1-Contratação de recursos humanos para atuação no desenvolvimento da gestão administrativa, financeira e contábil do projeto, bem como para o desenvolvimento das atividades técnicas e consultorias previstas. A1.3.2- Apoio a manutenção de um escritório regional de suporte a equipe técnica do projeto A1.3.3-Produção de conteúdos comunicação para divulgação e disseminação das experiências do projeto.	-Número de produtores agroextrativistas atendidos pelo projeto; -Número de empreendimentos comunitários atendidos; - Numero de reuniões de apresentação e planejamento, monitoramento e avaliação final do projeto; -Total de termos de cooperação realizados no âmbito do projeto; - Total de produtos de comunicação produzidos e distribuídos.	A1.3.1 - 100% (cem por cento) realizada A1.3.2 - 100% (cem por cento) realizada A1.3.3 - 100% (cem por cento) realizada

amortecimento), com assessoria; c. 03 termos de cooperação firmados com setor público ou privado para potencializar os resultados do projeto; d. 01 reunião de apresentação e planejamento do projeto; e. 02 reuniões de monitoramento e avaliação do projeto; f. 04 banners do projeto; g. 04 adesivos de veículos; h. 600 calendários personalizados com dicas de boas práticas de produção de castanha, borracha e óleo de copaíba.			
---	--	--	--

5. Impacto do Projeto (avaliação dos resultados):

Os aspectos mais relevantes ocorridos na execução do projeto inicialmente foram os reajustes técnicos de atividades e pelas dificuldades em relação à pandemia covid 2019 sendo realizadas alterações e remanejamentos necessários no primeiro semestre. A pandemia nos impôs vários desafios nas relações diretas com os beneficiários do projeto, sendo contornados e ajustadas inicialmente por aplicativo WhatsApp ou pelo técnico de campo residente no Distrito do Guariba, no qual faz parte da comunidade. Priorizamos o contato mais restrito mantendo as normas sanitárias vigentes.

Devido a restrições sanitárias o contato com setores públicos inicialmente ficou comprometido.

Associações que haviam acessados recurso CONAB na modalidade Formação de Estoque ficaram restrita a comercialização da produção via programas do governo PAA, além do governo federal diminuir drasticamente recursos dos programas.

Região de alto conflito agrário e invasão de áreas públicas, políticas adotadas pelo governo não possibilitava ao diálogo saudável sobre preservação e sustentabilidade com entorno RESEX.

Situação da Cooperativa Mista do Guariba- Comigua, que se encontra paralisada com problemas em sua estrutura física além de outros de ordem fiscal, seria uma das principais parceiras para construção da APL e fortalecimento da economia local, não foi possível sendo necessário o remanejamento de atividade e recursos.

O trabalho de campo efetivamente direto as comunidades se iniciaram no segundo semestre, porém foi necessário elaborar aditivo de prorrogação de tempo.

Porém os desafios foram superados e as atividades realizadas conforme previstas e remanejadas com a participação das famílias e comunidades.

O projeto buscou sempre desenvolver as relações éticas e igualitárias para homens e mulheres para exercerem as ações, no entanto, por questão cultural algumas atividades são realizadas apenas por homens. Buscamos uma efetiva participação de mulheres e jovens junto as atividades e maior inclusão nas decisões.

6. Avaliação dos riscos e oportunidades:

Riscos:

- a. Corte de recurso no orçamento do governo Federal, estadual ou municipais devido à pandemia da COVID-19, inviabilizando as discussões de possíveis parcerias;
- b. Aumento do desmatamento e conflitos agrários no entorno da Resex Guariba- Roosevelt;
- c. Falta de funcionamento do Conselho Deliberativo da Resex;
- d. Ausência de editais para apoio a pequenos projetos de organizações comunitárias no período de desenvolvimento do projeto;
- e. Disponibilidade de recursos nos programas e políticas públicas voltadas para agricultura familiar e sociobiodiversidade;
- d. Recuperação do preço de mercado para castanha em amêndoas e subprodutos;
- f. Instabilidade do mercado da castanha;
- g. Ausência de demarcação física da Resex;
- h. Ausência de fiscalização para contenção das pressões externas da Resex;
- i. Condições de estradas que dão acesso as comunidades para escoamento da produção;

Oportunidades:

- a. Demanda por produtos da sociobiodiversidade;
- b. Crescimento do mercado local com a instalação da mineradora NEXA com o Projeto Aripuanã;
- c. Agregação de valor por meio do beneficiamento da castanha do Brasil;
- d. Diversificação da produção comercializada no mercado local/regional;
- e. Disponibilidade de recurso nos programas PNAE e PAA;
- f. Alinhamento da proposta com as políticas públicas de contenção do desmatamento do Estado de Mato Grosso;
- g. Demanda dos mercados institucionais nos Municípios de Aripuanã e Colniza;

- h. Fortalecer uma aliança local entre extrativistas, pequenos e gestores municipais para o desenvolvimento sustentável, geração de renda e proteção da Resex Guariba Roosevelt;
- i. Equipe com capacidade técnica e conhecimento dos desafios regionais e experiência de trabalho com as comunidades tradicionais;
- j. Parcerias institucionais já estabelecidas com a EMBRAPA para desenvolvimento de ações no âmbito do projeto;
- l. Possibilidade de cooperação com municípios de Aripuanã, Colniza para garantir a continuidade das ações do projeto após encerramento;
- m. Realização de termos de cooperação com instituição de ensino, pesquisa e extensão rural (IFMT, UNEMAT, CEPLAC e EMPAER) para potencializar as ações do projeto e ampliar o atendimento a outras comunidades do entorno da Resex;

7. Lições Aprendidas

- Que por meio das atividades de incentivo à produção e melhoria dos processos de manejo e transporte da castanha do Brasil, borracha nativa, copaíba e farinha de mandioca, que são as principais cadeias produtivas da sociobiodiversidade e do agro extrativismo familiar da Resex Guariba-Roosevelt a produção Sustentável é possível;
- Muitos pequenos agricultores do entorno da Resex, assim como em outros assentamentos, possuem passivos de regularização ambiental que precisam ser corrigidos. Dentre as alternativas que se apresentam está a implantação de SAF e a otimização das áreas abertas para pastagem para evitar novos desmatamentos e visando a regularização;
- A contratação de equipe técnica fixa e de consultores, bem como a mobilização de parceiros para o atendimento da população tradicional, pequenos agricultores familiares e suas organizações nos processos de produção, comercialização e socialização de conhecimentos colabora para o sucesso das ações;
- A interface do Plano Estadual da Agricultura Familiar (PEAF-MT), Política Nacional de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, Plano Nacional para a Promoção da Sociobiodiversidade, Estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI) de Mato Grosso, Programa Aquisição de Alimentos-PAA, Política de Garantia de Preço Mínimo da Sociobiodiversidade- PGPMBio destas políticas com o PROJETO BIODIVERSO alinha-se no fortalecimento da atividade extrativista enquanto estratégia de desmatamento evitado, fortalecimento dos modos de vida da comunidade tradicional de seringueiros, agregação de valor por meio do beneficiamento e padronização de práticas de produção florestal não madeireira, geração de renda sustentável a partir da floresta em pé e fortalecimento dos instrumentos de gestão territorial e ambiental.

8. Conclusão

A execução do projeto BIODIVERSO REM através de gestão participativa das associações e comunidades ressalta que foi essencial para o desenvolvimento das atividades, essas parcerias são extremamente importantes para a sustentabilidade dessa iniciativa, tendo em vista a continuidade do trabalho após o término do projeto. Nesse contexto, o aprimoramento do desenvolvimento organizacional

das associações para a gestão dos negócios da floresta foram condições primordiais para o sucesso e continuidade das atividades e parcerias após finalização.

Portanto, durante a execução e na finalização do projeto as organizações que fazem parte estão em situação de conformidade com suas CNDs, estatutos, atas, registros financeiros, contábeis, etc., possibilitou de maneira efetiva o acesso a diversas políticas pública que fortaleceram a renda das famílias agroextrativista, como também assinaturas de contratos com empresas que valorizam os produtos da sociobiodiversidade através de pagamentos de serviços ambientais, modelo esse que sendo propagado e servindo de exemplos pra comunidades indígenas da região. Mas também é importante o acompanhamento de técnicos que proporcionaram o empoderamento dos agentes multiplicadores das boas práticas. Jovens, mulheres e os representantes das organizações sociais foram considerados interlocutores prioritários no processo, de modo que, para esses atores, além da relação frequente e contínua com os técnicos, os mesmos foram as referências para participar de oficinas de capacitação no âmbito do projeto.

Um dos principais objetivos do projeto estava focado em estimular a geração de renda e o desenvolvimento sustentável, por meio do apoio a produção e a agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade e do agroextrativismo comunitário da Resex e de pequenos produtores da zona de amortecimento.

Como exposto no objetivo geral do projeto de consolidar alternativas de geração de renda, fortalecimento organizacional, produção e desenvolvimento sustentável para seringueiros da Reserva Estadual Extrativista Guariba- Roosevelt e pequenos agricultores de sua zona de amortecimento como estratégia para proteção da biodiversidade e combate às mudanças climáticas.

Nesse contexto foi possível avançar, porém é necessária a continuação desses trabalhos desde o fortalecimento organizacional até a comercialização e o mercado consumidor desses produtos está cada vez exigente.

9. Referências Bibliográficas

10. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas e os produtos gerados ao longo do projeto.

Anexo 1 – Fotos das atividades, listas de presença, termos de recebimentos, atas de assembleias, contratos projeto cassa, relação de produtores, relatório produtos copaíba, roças de mandioca, casas de farinha, cvp e saf's baixo carbono.

Anexo 2 – Fotos, banner feira, Relatório EMBRAPA, N.F compra e venda castanha, farinha cvp, proposta fornecimento copaíba, carta de compromisso de compra e venda produção e atas assembleias;

Anexo 3 – Banners, adesivos carros, agendas.

REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de apoio nº 110/2020 - ASSOCIAÇÃO PACTO DAS ÁGUAS- ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

Relatório de auditoria final

2024-04-24

Criado em:	2024-04-24 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Maria Eduarda Isnard (mariaeduarda.isnard@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAgGYiNacnO_cjC8DbX61wZcT8fHW-jV_A

Histórico de "REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de apoio nº 110/2020 - ASSOCIAÇÃO PACTO DAS ÁGUAS- ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS"

-  Documento criado por Maria Eduarda Isnard (mariaeduarda.isnard@funbio.org.br)
2024-04-24 - 13:19:49 ADT
-  Documento enviado por email para everaldo@pactodasaguas.org.br para assinatura
2024-04-24 - 13:23:22 ADT
-  Contrato modificado por Maria Eduarda Isnard (mariaeduarda.isnard@funbio.org.br)
2024-04-24 - 14:12:41 ADT
-  Email visualizado por everaldo@pactodasaguas.org.br
2024-04-24 - 14:22:21 ADT
-  Mudança no contrato reconhecida por everaldo@pactodasaguas.org.br
2024-04-24 - 14:22:41 ADT
-  O signatário everaldo@pactodasaguas.org.br inseriu o nome Everaldo Dutra dos Santos ao assinar
2024-04-24 - 14:45:06 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Everaldo Dutra dos Santos (everaldo@pactodasaguas.org.br)
Data da assinatura: 2024-04-24 - 14:45:08 ADT - Fonte da hora: servidor

 Documento enviado por email para Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br) para assinatura

2024-04-24 - 14:45:11 ADT

 Documento enviado por email para matheus.ramos@funbio.org.br para assinatura

2024-04-24 - 14:45:11 ADT

 Documento enviado por email para Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br) para assinatura

2024-04-24 - 14:45:11 ADT

 Email visualizado por matheus.ramos@funbio.org.br

2024-04-24 - 15:10:05 ADT

 O signatário matheus.ramos@funbio.org.br inseriu o nome Matheus Duarte Ramos ao assinar

2024-04-24 - 15:10:40 ADT

 Documento assinado eletronicamente por Matheus Duarte Ramos (matheus.ramos@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-04-24 - 15:10:42 ADT - Fonte da hora: servidor

 Documento assinado eletronicamente por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-04-24 - 17:22:42 ADT - Fonte da hora: servidor

 Email visualizado por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

2024-04-24 - 17:41:44 ADT

 Documento assinado eletronicamente por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-04-24 - 17:42:03 ADT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.

2024-04-24 - 17:42:03 ADT
