

TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 215/2022 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO PROJETO “KAIRA KALIOKOTALA”, RELATIVO AO PROGRAMA REM MATO GROSSO – SUBPROGRAMA TERRITÓRIOS INDÍGENAS

1. O **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO**, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, neste ato regularmente representado por seu **Superintendente de Programas, Manoel Serrão Borges de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro de pesca, portador da cédula de identidade nº 986314, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.176.634-91, doravante denominado **Funbio**; e

2. A **ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ENAWENE NAWE**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Aldeia Lolowekwa Kotakowinakwa, Juína/MT, CEP: 78.320-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.633.629/0001-95, neste ato regularmente representada por seu **Presidente, Lalokwarise Detalikwaene Enawene**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 2503303-4, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.856.351-07, doravante simplesmente denominada **Responsável pelo Projeto**.

Resolvem, por este Instrumento, ENCERRAR O CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 215/2022, celebrado em 09 de novembro de 2022, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Funbio** e a **Responsável pelo Projeto**, de comum acordo, formalizam o encerramento do Contrato de apoio técnico e financeiro nº 215/2022, celebrado entre as partes em 09 de novembro de 2022, para implementação do Projeto “KAIRA KALIOKOTALA”, reconhecendo estar extinto o objeto do referido Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – A **Responsável pelo Projeto** deverá arquivar toda a documentação original relativa à execução do Projeto, por um período de cinco anos a contar da data de assinatura deste Termo, ou pelo prazo exigido pela legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior.

2.2 – A **Responsável pelo Projeto** compromete-se a utilizar todos os bens adquiridos com os recursos do Projeto exclusivamente em prol da recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira.

2.3 – Declaram as partes estarem quites com todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais e/ou previdenciários relacionados ao objeto acordado, sendo que a **Responsável pelo Projeto** se responsabilizará por eventuais encargos dessa natureza que venham a ser conhecidos em data superveniente à da assinatura deste instrumento.

2.4 – As Partes, neste ato, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação em relação às obrigações e direitos decorrentes do Contrato, ora formalmente encerrado, inclusive em relação às prestações de contas referentes a todo o Projeto, permanecendo válidas somente as obrigações constantes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

3.1 – Os seguintes documentos integram o presente instrumento:

- 1) Parecer Financeiro Final – Anexo A; e
- 2) Parecer Técnico Final – Anexo B

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

4.1 – A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

4.2 – As disposições deste Contrato refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

4.3 – As partes ratificam as regras de mediação e arbitragem para dirimir qualquer disputa, controvérsia, divergência ou litígio decorrente ou relacionada ao contrato ora encerrado, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do referido Contrato.

As Partes e duas testemunhas declaram e concordam que a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Encerramento e seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).

Assinam o presente, de forma eletrônica, com a ciência de duas testemunhas.

Pelo Funbio


Manoel Serrão Borges de Sampaio (22 de maio de 2024 16:27 ADT)
Manoel Serrão Borges de Sampaio
Superintendente de Programas

Pela Responsável pelo Projeto


Lalokwarise Detalikwaene Enawene (20 de maio de 2024 12:02 ADT)
Lalokwarise Detalikwaene Enawene
Presidente

Testemunhas:


Nome: Bruna Luyane Souza Santos Ribeiro
CPF: 051.911.011-03
ID: 2959.108 - SSPDF


Bruno Pinheiro (20 de maio de 2024 12:46 ADT)
Nome: Bruno Miceli Parede Pinheiro
CPF: 169.032.707-36
ID: 28921318-3 – DETRAN/RJ



Parecer financeiro nº. 091/2024 – (REM-MT)

2ª Prestação de Contas Final

Data: 09/05/2024

De: Simone Rubia – Assistente Financeiro

Para: Gerência REM Mato Grosso

Programa/Projeto: REDD Early Movers - REM Mato Grosso

Subprojeto: KAIRA KALIOKOTALA

Instituição responsável pelo Projeto: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ENAWENE NAWE

Objetivo do projeto: Capacitar novos agentes ambientais em parceria com instituições governamentais, realização de monitoramento territorial por meio terrestre e fluvial na área do perímetro total da Terra Indígena Enawene Nawe, restrição de atividades ilícitas ambientais na área de amortecimento do entorno da Terra Indígena, limpeza de limites e confrontação com propriedades particulares, fixação e limpeza de placas demarcatórias em todo o perímetro da Terra Indígena Enawene Nawe e iniciativa de conscientização voltados ao meio ambiente para membros da Comunidade Indígena Enawene Nawe sendo criança, jovens e adultos.

Classificação de Risco da Instituição: Risco Alto

Dados Contratuais:

	<u>Contrato inicial</u>	<u>Termo Aditivo</u>	<u>Total</u>
Vigência do Contrato	14 Meses	06 Meses	20 Meses
Início	09/11/2022	31/12/2023	09/11/2022
Encerramento	31/12/2023	30/06/2024	30/06/2024
Valor do Contrato	R\$ 199.995,60	R\$ -	R\$ 199.995,60
Funbio/REM-MT	R\$ 199.995,60	R\$ -	R\$ 199.995,60
Contrapartida	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Desembolsos:

Desembolsos	Valor	% Total do Projeto
1º Desembolso realizado em 02/12/2022	R\$ 79.289,00	39,65%
2º Desembolso realizado em 16/08/2023	R\$ 120.706,60	60,35%
A desembolsar	R\$ -	0,00%

Prestação de Contas:

Com base na Prestação de Contas final apresentada pela instituição, segue a análise abaixo:

2ª Prestação de Contas Final	01/06/2023 à 10/04/2024	
	Valor	
(A) Saldo Anterior	R\$	4.994,19
(B) Rendimento Bruto*	R\$	310,86
(C) 2º Desembolso	R\$	120.706,60
(D) Total da Receita (A+B+C)	R\$	126.011,65
(E) Valor Prestação de Contas	R\$	121.153,10
(F) Tarifas Bancárias	R\$	23,00
(G) Total de Despesa (E+F)	R\$	121.176,10
(H) Saldo do Projeto em 10/04/2024 (D-G)	R\$	4.835,55
(J) Saldo Bancário em 10/04/2024	R\$	4.835,55
(K) Diferença (H-J)	R\$	-
(L) Valor Prestação de Contas - Contrapartida	R\$	-

* Rendimento descontado de IR e IOF

- Analisamos a 2ª prestação de contas final e, referindo-nos aos recursos desembolsados pelo Funbio/REM-MT, apresentou uma execução de 97,23% para o período.
- Conferimos o extrato bancário e o relatório de despesas, e os mesmos estão de acordo com a conciliação realizada, não havendo discrepância informada na conciliação.
- A documentação comprobatória das despesas dos recursos Funbio/REM-MT foi analisada integralmente, não apresentando irregularidades.
- Não há contrapartida a ser apresentada no período.

Conclusão:

Por fim, informamos que a prestação final está aprovada, seguindo os critérios do Manual de análise de prestações de contas da modalidade desembolso.

Em relação aos recursos repassados pelo Funbio/REM-MT, a execução total foi de R\$196.540,10 representando 98,27% do valor contratual.

O saldo remanescente de R\$4.835,55 referente ao valor desembolsado pelo Funbio e/ou de rendimentos auferidos durante o período do Subprojeto foi devolvido em 06/05/2024 para a conta operativa do Programa/REM-MT, conforme comprovante anexo. Assim, consideramos financeiramente aprovada a prestação de contas e o projeto encerrado.

Apresentamos abaixo quadro informativo quanto ao resumo financeiro final do projeto:

RESUMO FINANCEIRO	VALORES ACUMULADOS	%
		TOTAL
Total Desembolsado ao Projeto	R\$ 199.995,60	100,00%
Total de Rendimentos Líquidos (Rendimento. - Tarifa)	R\$ 1.380,05	
(1) Total Prestado Contas	R\$ 196.540,10	98,27%
(2) Total da Contrapartida apresentada	R\$ -	%
Saldo do Projeto	R\$ 4.835,55	
(3) Saldo de Recursos Funbio	R\$ 4.835,55	2,42%
Saldo de Contrapartida a apresentar	R\$ -	%

Atenciosamente,

SRS
Simone Rubia
Assistente Financeiro

FAAC
Felipe Camello
Analista Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609354603291
06/05/2024 09:42:20

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:17
222602226 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO I ENAWENE NAWE

AGENCIA: 2226-8 CONTA: 38.478-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.519.000.024.486

VALOR TOTAL 4.835,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO B P BIODIVERSIDADE

AGENCIA: 3519-X CONTA: 24.486-4

NR. DOCUMENTO 552.226.000.038.478

=====

NR.AUTENTICACAO D.B03.F26.ADA.8F1.9B4

Transação efetuada com sucesso por: JG779493 AMERO YOKWARIENE KAHOLASE SALOMA.



ANEXO B: Formulário para o Relatório Final

Relatório Final

Título do projeto: Kaira Kaliokotala	
Instituição responsável: Associação do Povo Indígena Enawene Nawe	
Endereço: Aldeia Lolowekwa Kotakowinakwa	
Telefone: (65)99935-0345	
E-mail: associacaoenawenenawe2019@gmail.com	
Coordenador do projeto (nome e e-mail): Holikiari Enawene Holikiari@gmail.com	
Período de abrangência deste relatório: De 01/06/2023 a 09/01/2024	Período de abrangência do Projeto: De 09/12/2022 a 09/01/2024
Data de envio deste relatório: 15/03/2024	

1. 1- Andamento do projeto em relação aos objetivos para o último período de atividades

1. Objetivo específico 1: Planejamento das Atividades	
Resultado Esperado 1.1 Reunião participativa com a comunidade Enawene Nawe onde foram elaborados planos, metas e atividades do Projeto Kaira Kaliokotala. Reunião Institucional com a participação da FUNAI, IBAMA e Associação Indígena Enawene Nawe com objetivo de realizar parcerias para realização do curso de formação de agentes ambientais.	Status: Concluído Foram feitas as tratativas em conjunto com a comunidade Enawene Nawe juntamente com representantes do Projeto Kaira Kaliokotala. Foi firmada a parceria para curso de formação dos agentes ambientais indígenas do Projeto Kaira Kaliokotala em parceria firmada entre a Associação Indígena Enawene Nawe , FUNAI e IBAMA.
A111 – Planejamento das atividades Reunião de Apresentação do Projeto, objetivos e encaminhamentos. Concluída (100%) Atividade realizada 06/12/2022	
	

A112 – Planejamento das atividades

Reunião institucional entre Associação Indígena Enawene Nawe, FUNAI e IBAMA, para realização do curso de formação de agentes ambientais indígenas do Projeto Kaira Kaliokotala.

Concluída (100%)

Atividade realizada 11/01/2023




2. Objetivo específico 2:Curso de Capacitação de Agentes Ambientais	
Resultado Esperado 2.1 Tratativas formais realizadas junto a FUNAI e Superintendência do IBAMA de Mato Grosso para realização do Curso de Capacitação dos Agentes Ambientais Indígenas do Projeto Kaira Kaliokotala.	Status:Concluído As tratativas formais da Capacitação dos Agentes Ambientais Indígenas iniciaram no mês de Maio de 2023, e foram realizadas na Aldeia Lolowekwa Kotakowinakwa no mês de Setembro de 2023. Foi realizada a capacitação de cerca de 30 agentes ambientais, dos quais, 20 homens e 10 mulheres, que estão aptos a exercer os trabalhos de Monitoramento e Vigilância Territorial da Terra indígena Enawene Nawe.

A111 – Curso de Capacitação de Agentes Ambientais

Curso de Formação de Agentes Ambientais com a participação da FUNAI ,IBAMA e a Comunidade Enawene Nawe. Relatório do Ibama em anexo.

Concluída (100%)

Atividade realizada 02/09/2023 á 05/09/2023

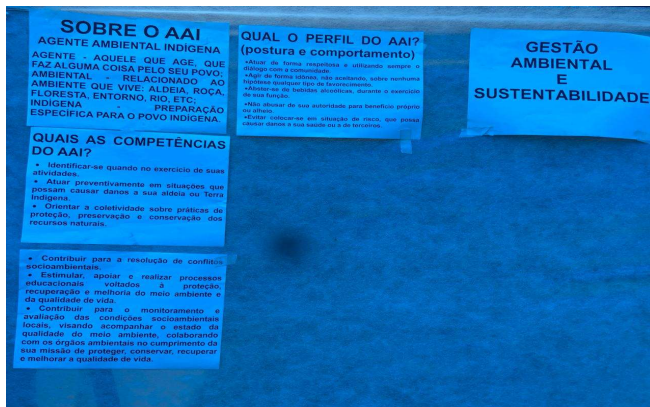

Anexo A2 – Relatório Final





3. Objetivo específico 3: Trabalho de Monitoramento Territorial e Ambiental

Resultado Esperado 3.1 Trabalho de Monitoramento Territorial e Ambiental realizado na Terra Indígena Enawene Nawe pelos agentes ambientais indígenas do Projeto Kaira Kaliokotala no período de meses de maio a dezembro de 2023. O referido trabalho foi executado através do planejamento e cronograma de atividades do Projeto incluindo expedições por meio fluvial e terrestre nos principais pontos vulneráveis da Terra Indígena Enawene Nawe, onde anteriormente ocorreram invasões de madeireiros e garimpeiros. Que pode ser acessado através do trabalho de monitoramento territorial e ambiental realizado pela equipe de agentes ambientais do Projeto Kaira Kaliokotala.	Status: Concluído Atividade realizada pelos agentes ambientais indígenas do Projeto Kaira Kaliokotala em parceria com a FUNAI. Foram realizadas várias expedições por meio terrestre e fluvial que através do trabalho de monitoramento Territorial realizada a equipe de agentes ambientais conseguiu cessar os invasores e combater as atividades ilícitas nas regiões limítrofes e interior da Terra Indígena Enawene Nawe. Que os equipamentos e materiais adquiridos pelo projeto foram essenciais nos trabalhos de Monitoramento Territorial e Ambiental realizados pela equipe de Agentes Ambientais Indígenas do Projeto Kaira Kaliokotala.
---	--


A111 – Trabalho de Monitoramento Territorial e Ambiental

Monitoramento Territorial e Ambiental realizado por expedições terrestre e fluvial.

Concluída (100%)

Atividade realizada 15/05/2023 á 29/11/2023



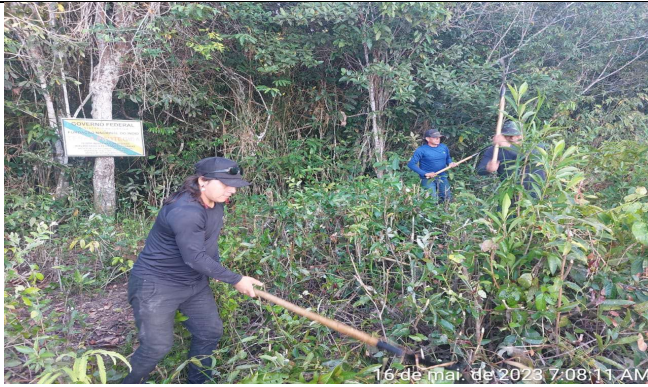







4. Objetivo específico 4: Avaliação do Projeto e Encerramento das Atividades	
Resultado Esperado 4.1 Reunião realizada com a Comunidade Enawene Nawe na Aldeia Lolowekwa Kotakowinakwa com objetivo de apresentar os resultados e objetivos alcançados pelo projeto através das atividades de Monitoramento Territorial e Ambiental realizadas pelos Agentes Ambientais Indígenas. Apresentação total das ações e atividades e encerramentos do projeto e das atividades.	Status: Concluído No dia 11/12/2023, foi realizada reunião de apresentação dos resultados alcançados pelo projeto através do trabalho de monitoramento Territorial e Ambiental realizado pelo Projeto Kaira Kaliokotala. Finalização das atividades e encerramento do projeto.

A111 – Avaliação do Projeto e Encerramento das Atividades

Reunião de Apresentação

Resultados alcançados pelo Projeto, finalização das Atividades e encerramento do Projeto Kaira Kaliokotala.

Concluída (100%)

Atividade realizada 11/12/2023





2.

3. **2- Resultados alcançados em relação aos objetivos planejados**

Sistematize, de forma associada, os resultados obtidos para cada atividade traçada ao longo do projeto, que vocês usaram como base para desenvolver o documento de projeto (*não é obrigatório o formato em tabela para a redação do relatório, mas sim o preenchimento dos itens*).

Objetivos específicos	Atividades previstas	Resultados esperados	Resultados obtidos / produtos gerados
1.Planejamento das Atividades	1.1 Planejamento e cronograma das atividades do Projeto	1.2 reunião de Apresentação do Projeto e Formalização de parcerias institucionais	1.3 Parcerias institucionais formadas com o Projeto Kaira Kailiokotala, Capacitação de Agentes ambientais indígenas e acompanhamento das atividades de Monitoramento Territorial e Ambiental na Terra Indígena Enawene Nawe.
2.Curso de Capacitação de Agentes Ambientais	2.1 Realização de curso de Capacitação de agentes ambientais e noção básica de Monitoramento Territorial e Ambiental.	2.2 Curso teórico e prático realizado pela FUNAI e IBAMA sobre as técnicas de monitoramento territorial e ambiental, legislação ambiental vigente.	2.3 Formação 30 de Agentes Ambientais sendo 20 homens e 10 mulheres através do projeto Kaira Kaliokotala.

Anexo A2 – Relatório Final

3.Trabalho de Monitoramento Territorial e Ambiental	3.1 Trabalho de Monitoramento Territorial e Ambiental da Terra Indígena Enawene Nawe nas regiões limítrofes e no interior.	3.3 Coibir atividades e práticas ilícitas através do trabalho de monitoramento Territorial e ambiental através das expedições Fluvial e Terrestre.	3.3 Foram desenvolvidas ações em parceria com a FUNAI e IBAMA cujo o objetivo da Formação dos agentes ambientais para combater ilícitos e invasão de madeireiros e garimpeiros nas regiões limítrofes e interior da Terra Indígena Enawene Nawe.
4.Avaliação do Projeto e Encerramento das Atividades	4.1 Apresentação das metas e objetivos alcançados. Encerramento das atividades e do Projeto kaira Kaliokotala	4.4 Apresentação de Relatórios elaborados pelos agentes ambientais durante a realização dos trabalhos de Monitoramento Territorial e Ambiental. Formalização de ata de reunião realizado o encerramento das atividades do Projeto Kaira Kaliokotala.	4.3 Participação do Coletivo Comunitário na Avaliação dos Trabalhos e execução do projeto local.

3- Avaliação de Impacto do Projeto

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (<i>quantificar</i>)
Planejamento das atividades de Monitoramento Territorial em conjunto com a Comunidade Enawenê Nawê.	Reuniões com a comunidade Enawenê Nawê no coletivo para elaborar Plano e Metas das atividades a serem desenvolvidas durante a execução do projeto. Reunião com instituições parceiras FUNAI e IBAMA a fim de firmar parceria com objetivo de realizar a capacitação dos Agentes Ambientais e posteriormente realizar in loco atividade de vigilância e monitoramento territorial da Terra Indígena Enawene Nawe.	Número de participantes e aldeia envolvida no projeto a ser atendida com as atividades de vigilância e monitoramento territorial.	<u>Concluída</u> População de 1180 pessoas, uma única aldeia (Lolowekwa kotakowinakwa, Terra Indígena Enawene Nawe, município de Juína – MT.
Formação e Capacitação de Agentes Ambientais da Etnia Enawena Nawe.	Curso de capacitação de Agentes Ambientais e noções básicas de monitoramento territorial a fim de aperfeiçoar a execução dos trabalhos em conformidade com a lei vigente.	Número de agentes ambientais capacitados	<u>Concluída</u> Formação e Capacitação de 30 agentes indígenas da etnia Enawene Nawe que realizará os trabalhos projeto Kaira Kaliokotala em conjunto com as instituições parceiras FUNAI e IBAMA, no objetivo de realizar atividades voltadas à vigilância e monitoramento territorial da Terra Indígena Enawene Nawe nos municípios de Juína-MT, Sapezal –MT e Comodoro –MT. Será realizado a Formação e Capacitação de 10 mulheres e 20 homens que serão escolhidos pela comunidade indígena enawene nawe através de reunião coletiva.

Monitoramento e vigilância do território da Terra Indígena Enawene Nawe	Expedição via Terrestre e Fluvial no perímetro da TI Enawenê Nawê, com finalidade de coibir as práticas ilícitas para alcançar os resultados em conformidade ao cronograma e planejamento do Projeto Kaira Kaliokotala.	Número de ações desenvolvidas para o monitoramento ambiental e territorial	<u>Concluído</u> Foram realizados os trabalhos de Monitoramento Territorial e Ambiental com a participação 20 pessoas envolvidas, sendo 04 pessoas por instituição e 16 agentes ambientais , sendo formado equipe de 04 pessoas para execução dos trabalhos em conformidade com cronograma de ações dos projetos. As atividades foram realizadas por meio terrestre e fluvial sendo dividindo-se a equipe para realização das atividades de vigilância e monitoramento territorial na Terra Indígena Enawene Nawe.
Apresentação dos resultados e elaboração de relatórios	Reunião de avaliação das atividades de monitoramento territorial e ambiental executadas.	Elaboração e apresentação de relatórios de atividades executadas.	<u>Concluída</u> Apresentação dos relatórios elaborados das atividades executadas pelo projeto kaira Kaliokotala e aprovados pela comunidade Indígena Enawene Nawe .

4- Perguntas referentes ao andamento do Projeto

1. Quais foram as contingências mais significativas para o andamento do projeto? Por que ocorreram e de que forma vocês conseguiram contornar a situação, caso tenham sido negativas? O que elas agregaram, caso tenham sido positivas?

No início do projeto tivemos alguns problemas na formalização da parceria com a Superintendência do IBAMA em Mato Grosso, devido a Transição do Governo Federal não havia servidor lotado na função para dar os encaminhamentos no procedimentos para realização do curso de formação dos agentes ambientais indígenas ,através de vários diálogos e com a nova nomeação do novo superintendente do IBAMA /MT de imediato foi atendido a solicitação e a formalização da parceria na realização do curso de formação que ocorreu no mês de Setembro de 2023.

2. Quais os aspectos mais relevantes que foram detectados no decorrer da execução do projeto e o que vocês gostariam de garantir em outra proposta? E o que teriam tentado evitar?

Aspectos relevantes detectados na execução do projeto foi a parte da logística principalmente na questão de transporte Terrestre, que devido ao Trabalho de Monitoramento Territorial e Ambiental o projeto deveria ter um veículo exclusivo para atender as demandas dos agentes ambientais que realizam o trabalho periodicamente, que os veículos utilizados no trabalho eram particular da comunidade Enawene Nawe e que constantemente apresentam problemas mecânicos.

Devido a este fato ações foram prejudicadas de uma certa forma ,mais que de certa forma foram supridas em parcerias firmadas com a FUNAI que forneceu o apoio necessário na parte de logística do Projeto Kaira Kaliokotala.

3. O que deixou de ser feito por falta de apoio de políticas públicas? Isto deixou algum aprendizado? De que forma os responsáveis foram informados?

Em referência aos apoio realizados pelas políticas públicas notamos o déficit de servidores nas repartições públicas, que os trabalhos que envolviam os parceiros institucionais tinha que ser agendado as atividades com no mínimo 30 dias de antecedência isso fez atrasar algumas ações e atividades do cronograma do Projeto.

Vimos que as parcerias institucionais são muito importantes para execução das atividades do projeto, porém os prazos fixados na execução do projeto deveriam ser prolongados devido a tramitação burocráticas adotadas pelas repartições públicas, que devem ser tratadas com cautela para não prejudicar o desenvolvimento das ações e atividades ligadas ao projeto.

4. Caso os beneficiários fossem chamados a expor suas opiniões a respeito do projeto e a discorrer sobre as atividades desenvolvidas, qual seria a mais adequada para se detectar essa avaliação? Depoimentos livres? Quem os daria (citar nomes e forma de contato); depoimentos orientados (citar nomes e forma de contato)? Onde? Como vocês têm avaliado o projeto do ponto de vista dos beneficiários? Se houver alguma avaliação já realizada, favor anexar ou relatar detalhadamente, com fontes e imagens.

A melhor forma de avaliação sobre as atividades exercidas pelo projeto Kaira Kaliokotala através de depoimentos livre, podendo ser realizado com membros da Aldeia Lolowekwa Kotakowikwa, podendo ser feito entrevista pessoalmente, mais sendo necessário a participação de tradutor no idioma Aruak devido a dificuldade no entendimento da língua portuguesa por parte dos indígenas Enawene Nawe.

Os beneficiários receberam as ações e atividades do projeto de forma satisfatória podendo frisar a proteção territorial e ambiental bem como a formação dos indígenas que são responsáveis pela proteção da Terra Indígena Enawene Nawe.

Foi realizada uma avaliação pela TNC em relação às atividades executadas, porém não tivemos acesso às informações após a entrevista realizada na aldeia Lolowekwa Kotakowinakwa.

5. Quais instituições e projetos teriam a ensinar para vocês? Por que? O que vocês teriam para contribuir com outros projetos e instituições – públicas ou não, sobre seu trabalho. Por que?

A Sema poderia também fazer parte das ações do Projeto Kaira Kaliokotala podendo transmitir os conhecimento e trabalhos de fiscalizações e monitoramentos das regiões limítrofes e no interior da Terra Indígena Enawene Nawe, foram feitas algumas tratativas na SEMA de Juína-MT, porém sem sucesso na formalização de parceria.

Percebemos que atuação dos Agentes Ambientais Indígenas na região da Terra Indígena Enawene Nawe, com abrangência de 03 município sendo (Juína-MT, Sapezal-MT e Comodoro –MT) teve resultados satisfatório podendo coibir atividade ilícitas no interior e limítrofes da Terra Indígena Enawene Nawe.

6. Em que, efetivamente, vocês viram diferença em relação ao impacto do projeto sobre a biodiversidade e o desmatamento. Fez diferença? Qual?

Durante o período de atuação do Projeto foram realizados trabalhos periódicos nas atividades e ações de monitoramento Territorial e ambiental com a presença dos agentes ambientais na Terra Indígena Enawene Nawe, podendo assim coibir ações presentes e futuras de atividades ilícitas voltadas à extração florestal e mineral.

O curso de capacitação dos agentes ambientais teve uma papel fundamental no projeto trazendo conhecimento e noções básicas de procedimentos de monitoramento territorial.

7. Quais suas perspectivas de futuro? Discorram sobre as realizações viáveis, mas também sobre as aparentemente inviáveis, sobre as quais que vocês fariam um tremendo esforço para conseguir viabilizar (estamos aqui falando daquelas que dependem também de sua atuação e não apenas da de terceiros. Deixe mais claro o que depende de vocês e não apenas dos potenciais parceiros).

A realização do Projeto Kaira Kaliokotala foi o início de um trabalho que vinha sendo discutido há muitos anos pela comunidade Enawene Nawe, que hoje tornou-se realidade e que terá continuidade através da parceria com a FUNAI que tem em seus programa ações voltadas à fiscalização e monitoramento territorial.

O projeto Kaira Kaliokotala nas execuções das atividades pode desenvolver ações viáveis desde do planejamentos das atividades, Curso de Capacitação e no trabalho de monitoramento Territorial e Ambiental que contribuiu com as metas do projeto, mais teve ponto inviáveis que prejudicou o andamento das atividades principalmente na formalização das parcerias mais pode ser superado no decorrer do projeto através da tratativas institucionais se tornaram pontos viáveis na execução das atividades voltadas ao projeto.

8. O projeto acarretou em desdobramentos? Quais?

O projeto teve planejamento das atividades, que foram dividas em 04 objetivos específicos, dos quais seguirão metas estabelecidas até a conclusão e encerramento das atividades do Projeto Kaira Kaliokotala.

9. Os procedimentos de acompanhamento do Funbio, tanto na parte financeira quanto na parte física (andamento) foram eficazes? O que poderia ser melhorado?

Os procedimentos e acompanhamento do FUNBIO foram ótimos, bem como na capacitação realizada em Cuiabá-MT, formalização do contrato , repasse financeiro e acompanhamento na execução do Projeto, podendo assim trazer conhecimento aos participantes responsáveis pelo projeto.

Pelo fato da Comunidade Enawene Nawe ser de recente contato o Coordenador e Ordenador de despesas tiveram muita dificuldade na parte de operação do Sistema cérebro, vimos que o sistema poderia ser menos burocrático nas informações podendo facilitar nas operações exigidas.

Outro ponto seria a participação de um funcionário do FUNBIO para acompanhar o desenvolvimento e execução do projeto de forma presencial em cada região contemplado pelo programa REM no período de 5 dias, trimestralmente no decorrer do andamento das atividades

podendo auxiliar as dúvidas e lançamento de informação nos sistema cérebro onde poderia evitar o atraso nas informações contidas no sistema.

10. Como foi vista a parceria do Funbio com o projeto? Quais foram os pontos fortes e fracos dessa parceria? No caso de críticas negativas, quais as alternativas que poderiam ser seguidas?

A parceria firmada com o FUNBIO ocorreu de forma positiva:

Pontos fortes

Apoio de forma direta as ações e Atividades do Projeto Kaira Kaliokotala;

Assegurou o direto de preservação da Biodiversidade da Terra Indígena Enawene Nawe;

Realização de repasse financeiro em tempo hábil para execução das atividades do projeto;

Trouxe conhecimento e experiência na execução de Projeto;

Oportunidade na classificação de projeto voltados a Comunidade Indígena de recente contato;

Apoio e respeito na preservação ambiental, cultural e tradicional do Povo Enawene Nawe.

Pontos Fracos

Dificuldade de comunicação “falta de tecnologia na aldeia”;

Falta de reunião mensal com os responsáveis pelo projeto;

Dificuldade de Operar Sistema cérebro e GPWEB;

Falta de representante do FUNBIO e SEMA para o acompanhamento das atividades do projeto e apoio nas dúvidas decorrentes do projeto “presença pessoal”;

Dificuldades em parceria com SEMA /Juína-MT, sobre o argumento de competência em atuar nas Terras Indígenas, passando somente a responsabilidade ao IBAMA, com finalidade de realizar fiscalização das regiões limítrofes e no interior da Terra Indígena Enawene Nawe;

Falta de Veículo exclusivo do Projeto para atender os Agentes Ambientais nos trabalhos terrestre de monitoramento territorial na Terra Indígena Enawene Nawe;

Recurso insuficiente para desenvolvimento das atividades do projeto, devido a abrangência territorial ser complexa, podendo ser sugerido ao Programa REM MT, a necessidade de acrescer o montante do recurso para os projetos locais para os próximos editais.

11. Complete com o que faltou ser dito por vocês ou perguntado por nós.

Podemos frisar que estão superadas as falas , opiniões e esclarecimentos de ambas as partes.

Vivemos na região amazônica e sofremos constantemente pressão do agronegócio, hidrelétricas, mineração e setor de base florestal, sabemos que somos detentores das maiores riquezas naturais, que isso desperta atenção em vários aspectos, precisamos de iniciativa financeiras para preservação de nossa Território sagrado e consolidado como Terra Indígena Enawene Nawe.

No mais, somente agradecemos a parceria firmada e dizer que contamos com FUNBIO na defesa do direito e da causa indígena.

REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de apoio nº 215/2022 - ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ENAWENE NAWÉ

Relatório de auditoria final

2024-05-22

Criado em:	2024-05-14 (Fuso horário do Uruguai)
Por:	Maria Eduarda Isnard (mariaeduarda.isnard@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAYh6KMxLwls3QvT5QIRe0SZhNv9Zus27j

Histórico de "REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de apoio nº 215/2022 - ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ENAWENE NA WE"

-  Documento criado por Maria Eduarda Isnard (mariaeduarda.isnard@funbio.org.br)
2024-05-14 - 16:50:15 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para detalikwaenel@gmail.com para assinatura
2024-05-14 - 16:52:06 ADT
-  Email visualizado por detalikwaenel@gmail.com
2024-05-20 - 11:59:44 ADT- Endereço IP: 74.125.210.199
-  O signatário detalikwaenel@gmail.com inseriu o nome lalokwarise Detalikwaene Enawene ao assinar
2024-05-20 - 12:02:52 ADT- Endereço IP: 24.152.31.151
-  Documento assinado eletronicamente por lalokwarise Detalikwaene Enawene (detalikwaenel@gmail.com)
Data da assinatura: 2024-05-20 - 12:02:54 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 24.152.31.151
-  Documento enviado por email para Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br) para assinatura
2024-05-20 - 12:02:57 ADT
-  Documento enviado por email para Bruna Ribeiro (bruna.ribeiro@funbio.org.br) para assinatura
2024-05-20 - 12:02:57 ADT
-  Documento enviado por email para Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br) para assinatura
2024-05-20 - 12:02:58 ADT

 Documento assinado eletronicamente por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-05-20 - 12:46:30 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 201.17.108.8

 Email visualizado por Bruna Ribeiro (bruna.ribeiro@funbio.org.br)

2024-05-21 - 8:49:46 ADT- Endereço IP: 187.43.189.249

 Documento assinado eletronicamente por Bruna Ribeiro (bruna.ribeiro@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-05-21 - 8:50:03 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.43.189.249

 Documento assinado eletronicamente por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-05-22 - 16:27:10 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50

 Contrato finalizado.

2024-05-22 - 16:27:10 ADT
